ต้นฉบับ

จังหวัดศรีสะเกษ

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

สัญญาจ้างที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ว่าจ้าง / จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร

เงินค่างานทั้งสิ้น	๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐	บาท		
เวลาทำการ	๑๘๐	วัน		
เริ่มต้นสัญญาวันที่	๒๕	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๖๖
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๒๐	เดือน	กันยายน	พ.ศ. ๒๕๖๖
ค่าประกันสัญญา	๑,๔๙๘,๗๗๕.๐๐	บาท		
ค่าอากรแสตมป์	๒๘,๐๒๐.๐๐	บาท	(รวมคู่ฉบับ)	
ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ	๗๔,๙๓๘.๗๕	บาท		

<u>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</u>

(ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ที่ คค ๐๖๐๕๓/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ ตำแหน่งที่ ๑ ประธานกรรมการฯ
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ
๓. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรรมการฯ
๔. นายสมปราชญ์ สวนหมาก นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

<u>ผู้ควบคุมงาน</u>

๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม) ผู้ควบคุมงาน
๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงไพรบึง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ต้นฉบับ

พ.๑-๐๕
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค. ๔๕

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ ศก.๒/ ๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. ☑ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

๒. หน่วยงาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. จ้าง / ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗

ชื่อสายทางหรือตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ

จาก กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐

ปริมาณงาน ๓.๘๐๐ กิโลเมตร จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

อนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๔๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่ - ลงวันที่ -

๗. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ตามรายละเอียดปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ รวมค่างาน ๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๙๖,๓๒๕.๐๐ บาท

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

ตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๙๘,๗๗๕.๐๐ บาท โดย

☐ เงินสด

☐ เช็คหรือดราฟท์ ของธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

☑ หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๒๑๒๓๐๑๔๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

☐ หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

☐ พันธบัตรรัฐบาลไทย เลขที่ - ลงวันที่ -

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ % (สัญญาข้อ ๖)

๑๑. ☑ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๙๓๘.๗๕ บาท

☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน)

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก

(นางเขมิกา ประมวลธนกร)

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (บ)

หมายเหตุ .....

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ .

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เลขที่ ๔๙๙ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง โพนข่า อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โดย นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนน - ตำบล/แขวง ด่าน อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดย นายปริญญา สาลีวัน กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๑๘๓๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ - อยู่บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ - ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ณ - ตำบล บักดอง อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๖ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑, ๒	จำนวน ๒ เล่ม
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือ บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรการปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

๒.๕	ผนวก ๕	รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	จำนวน - เล่ม
๒.๗	ผนวก ๗	คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร (Markings) ภาค ๒ ฉบับปี ๒๕๓๓ และรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) ฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑	จำนวน ๒ เล่ม
๒.๘	ผนวก ๘	ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง	จำนวน - เล่ม
๒.๙	ผนวก ๙	ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	สำเนาหนังสือยืนยันราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของบริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ที่ ทร.๑๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๔ หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	เงื่อนไขการเสนอแผนงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๑๕	ผนวก ๑๕	การจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๖	ผนวก ๑๖	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๗	ผนวก ๑๗	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)	จำนวน ๑๗ หน้า
๒.๑๘	ผนวก ๑๘	หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของโรงงานผสมแอสฟัลต์	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๙	ผนวก ๑๙	แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๐	ผนวก ๒๐	แบบป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒๑	ผนวก ๒๑	เงื่อนไขแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒๒	ผนวก ๒๒	เงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยชุดเครื่องจักรงานบำรุงทางแบบ Hot Mix In – Place Recycling	จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๒๑๒๓๐๑๔๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๘,๗๗๕.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๙๖๑,๐๑๔.๐๒ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสิบสี่บาทสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสีวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หาสายรุ้งอรุณ จำกัด HASAIRUNGAROON CO.,LTD.

หมายเลขอางอิง : P090007300636

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ส.9

☑ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

☑ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 3 5 5 6 5 0 0 0 3 2 4 สาขาที่ 0

ที่อยู่:อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 24 หมู่ที่ 11

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ด่าน

อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 3 3 1 6 0

ชื่อคู่สัญญา กรม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 4 0 3 8 0 สาขาที่

ที่อยู่:อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ - หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง โพนข่า

อำเภอ/เขต เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 3 3 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 25/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 20/09/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 141

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66111081543
วันที่: 29/03/2566
จำนวนเงิน 28,015.00 บาท
(สองหมื่นแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)
DLN: อส900006000093300903092566032902000100
UID: 000060002566032930900063O

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* 28,014,485.99

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	28,015.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	28,015.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย

สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6 200 กม.1 000 ระยะทาง 3800 กิโลเมตร

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 1,498,775.00 บาท

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed
3EE3D7C47C25741E5B60A540886B3CAC55BE4BE215E85174FA334A9061C40E56E41AFF69ACDD
Date 2023-03-29 10:38:59

ยื่นวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร	**วันชำระเงิน/วันนำส่ง** 29/03/2566
ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด	**เดือน/ปีภาษี**
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-3355-65000-32-4	**ประเภทการชำระ** อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090007300636	66111081543	********28,015.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองหมื่นแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)		28,015.00

อ.ส.9

Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2023-03-29 10:38:58

ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ผู้รับเงิน

(นางทัศสุขนีย์ เต่ารั้ง)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

03246603299425593594



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 03246603299425593594

เลือกยื่นตราสาร ☑ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ☐ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3355 65000 32 4

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9940 00140 38 0

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา กรม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 25/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 20/09/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 141

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 28,014,485.99

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 1,498,775.00 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 28,015.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 28,015.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66111081543

วันที่ชำระเงิน 29/03/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date 2023-03-29 10:39:00

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีสะเกษ ชื่อบัญชี บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๑ - ๖ - ๐๖๓๐๓ - ๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลวน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

.....ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๙๖,๓๒๕.๐๐ บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น **หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย** เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทัศราหรุงอรุณ จำกัด THASARUNGAROON CO.,LTD.

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ **๒๐ (ยี่สิบ)** ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ **๒๐ (ยี่สิบ)** ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สวลีจันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทหารชัยบูรณ จำกัด
THARNCHAIBOONGAROON CO.,LTD.

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน ๒,๙๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (**เงินสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ..-.. (..-..) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด..-.. (..-..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด..-.. (..-..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สวลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทศรัชรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) ปี - เดือน (เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสีงัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทวีทรัพย์ทรงสุวรรณ จำกัด
TAWEESUPTRUNGAROON CO.,LTD.

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๔,๙๓๘.๗๕ บาท (เงินเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..-.. บาท (..-..) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลี้วัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทวีทรัพย์อรุณ จำกัด
SAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด **๑๕ (สิบห้า)** วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด **๗ (เจ็ด)** วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก **คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง** หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ **๑๐ (สิบ)** ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรัชรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลาน) กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางเขมิกา ประมวลธนกร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
(ฝ่ายบริหาร)

(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นายปิยะ กุลวงค์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ต้นฉบับนี้ ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๒๘,๐๑๕.๐๐ บาท
และปิดอากรแสตมป์คู่ฉบับ เป็นเงิน ๕.๐๐ บาท

ต้นฉบับ

บัญชีมอบทางหลวง

ระหว่าง

จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

กับ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ตามสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินค่างานตามสัญญา ๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ขอมอบทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ให้แก่บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ไว้ดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอุปสรรคในการเข้าดำเนินการ และในระหว่างนี้ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ทั้งนี้จะต้องดูแลความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง

ทำการมอบ/รับมอบ เมื่อวันที่ **๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖**

(ลงชื่อ) _____ ผู้มอบ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับมอบ

(นายปริญญา สาลีวัน) กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นายคณากร สุขแสวงวัฒนันท์) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
(ฝ่ายปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นางเขมิกา ประมวลธนกร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
(ฝ่ายบริหาร)

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(นายปิยะ กุลวงค์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เลขที่ ๔๙๙ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง โพนข่า อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โดย นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนน - ตำบล/แขวง ด่าน อำเภอ/เขต ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ โดย นายปริญญา สาลีวัน กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๑๘๓๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ -) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ - อยู่บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ - ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ลงนาม..... ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม..... ผู้รับจ้าง

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๖ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑, ๒ จำนวน ๒ เล่ม

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือ บัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า

(ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

๒.๔ ผนวก ๔ รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรการปรับราคา จำนวน ๗ หน้า

ต้นฉบับ

๒.๕ ผนวก ๕	รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖	คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	จำนวน - เล่ม
๒.๗ ผนวก ๗	คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร (Markings) ภาค ๒ ฉบับปี ๒๕๓๓ และรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) ฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑	จำนวน ๒ เล่ม
๒.๘ ผนวก ๘	ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง	จำนวน - เล่ม
๒.๙ ผนวก ๙	ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๐ ผนวก ๑๐	สำเนาหนังสือยืนยันราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ของบริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ที่ ทร.๑๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๔ หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑	คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๒ ผนวก ๑๒	คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๓ ผนวก ๑๓	เงื่อนไขการเสนอแผนงาน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๔ ผนวก ๑๔	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๒๐ หน้า
๒.๑๕ ผนวก ๑๕	การจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๖ ผนวก ๑๖	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๗ ผนวก ๑๗	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)	จำนวน ๑๗ หน้า
๒.๑๘ ผนวก ๑๘	หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของโรงงานผสมแอสฟัลต์	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๙ ผนวก ๑๙	แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๐ ผนวก ๒๐	แบบป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒๑ ผนวก ๒๑	เงื่อนไขแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒๒ ผนวก ๒๒	เงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยชุดเครื่องจักรงานบำรุงทางแบบ Hot Mix In – Place Recycling	จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.
ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ต้นฉบับ

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ ๒๑๒๓๐๑๔๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๘,๗๗๕.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๙๖๑,๐๑๔.๐๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสิบสี่บาทสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๑๖๐๖๓๐๓๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน _____-_____บาท (_____-_____) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน_____-_____บาท (_____-_____) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน_____-_____บาท (_____-_____) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน_____-_____ ให้แล้วเสร็จภายใน_____-_____

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน_____-_____บาท (_____-_____) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน_____-_____ ให้แล้วเสร็จภายใน_____-_____

.....ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน_____-_____บาท (_____-_____) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร_____-_____สาขา_____-_____ชื่อบัญชี_____-_____เลขที่บัญชี_____-_____

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๙๖,๓๒๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า

จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน ๒,๙๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ___-___วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด___-___วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ___-___ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก

สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) ปี ___-___ เดือน (เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗๔,๙๓๘.๗๕ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่

ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด

เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

ต้นฉบับ

พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสีงัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเขมิกา ประมวลธนกร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายปิยะ กุลวงค์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๐๒๔๘๒๒
เลขคุมสัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๒๐๙๕๔

รายการแก้ไขครั้งที่ 1
แก้ไขแบบรายละเอียดงานโครงสร้างและแบบงานทาง
รายการแก้ไขดังนี้
1.แก้ไขข้อขัดแย้งในแบบงานโครงสร้างสะพาน และเพิ่มรายละเอียด
ปริมาณ CEMENT CONTENT โดย
- ยกเลิก SHEET NO. 200-213,215-219,221,223-256 289,305,297
- ให้ใช้ SHEET NO. 200/R1-213/R1,215/R1-219/R1,221/R1, 223/R1-256/R1,289/R1,306/R1,297/R1
2.แก้ไขข้อขัดแย้งในแบบงานทางโดย
- ยกเลิก SHEET NO. 76-77
- ให้ใช้ SHEET NO. 76/R1-77/R1

ออกแบบ DOH & CONSULTANT ตรวจ 2 มิ.ย. 60
เห็นชอบ 5 ก.ย. 60 อนุญาต 6/6/60
ผลบ. แทนอธิบดี

รายการแก้ไขครั้งที่ 2
แก้ไขแบบรายละเอียดงานโครงสร้างสะพาน , งานทาง
รายการแก้ไขดังนี้
1.แก้ไขข้อขัดแย้งในแบบงานโครงสร้างสะพานโดย
- ยกเลิก SHEET NO. 261,268-271,278,282-286,288 ,83
- ให้ใช้ SHEET NO. 261/R1,268/R1-271/R1,278/R1,282/R1 -286/R1, 288/R1,83/R1

ออกแบบ DOH & CONSULTANT ตรวจ 7 ส.ค. 61
เห็นชอบ 17 ส.ค./61 อนุญาต 8 ส.ค. 61
ผลบ. แทนอธิบดี

KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

STANDARD DRAWINGS

FOR

HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION

2015 REVISION

รายการแก้ไขครั้งที่ 3
แก้ไขแบบรายละเอียดงานทาง รายการแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขข้อขัดแย้งในแบบงาน CONCRETE BARRIER
- ยกเลิก SHEET NO. 84,86
- ให้ใช้แบบ SHEET NO.84/R1,86/R1
2. แก้ไขตารางการคำนวน WIDENNING DETAILS
- ยกเลิก SHEET NO.27
- ให้ใช้ SHEET NO. 27/R1

ออกแบบ DOH & CONSULTANT ตรวจ 6/ ก.ค./61
เห็นชอบ 10/10/61 อนุญาต 11 ต.ค. 61
ผลบ. แทนอธิบดี

รายการแก้ไขครั้งที่ 4
แก้ไขแบบรายละเอียดงานโครงสร้าง รายการแก้ไขดังนี้
- ยกเลิก SHEET NO. 255/R1, 283/R1, 299 , 234/R1 ,297/R1, 305
- ให้ใช้ SHEET NO. 255/R2, 283/R2, 299/R1 ,234/R2, 297/R2, 305/R1

ออกแบบ DOH & CONSULTANT ตรวจ 3 ธ.ค. 62
เห็นชอบ 3/12/62 อนุญาต 4/12/62
ผลบ. แทนอธิบดี

รายการแก้ไขครั้งที่ 5
แก้ไขแบบรายละเอียดงานโครงสร้าง รายการแก้ไขดังนี้
- ยกเลิก SHEET NO. 256/R1, 269/R1, 278/R1, 288/R1, 307, 333, 212/R1, 213/R1
- ให้ใช้ SHEET NO. 256/R2, 269/R2, 278/R2, 288/R2, 307/R1, 333/R1, 212/R2, 213/R2

ออกแบบ DOH & CONSULTANT ตรวจ 28 ม.ค. 64
เห็นชอบ 1/2/64 อนุญาต 1/2/64
ผลบ. แทนอธิบดี

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

กษ.ทล.๒

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566



โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000


ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	–	A

TITLE SHEET

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.6+200

จุดสิ้นสุดโครงการฯ กม.10+000

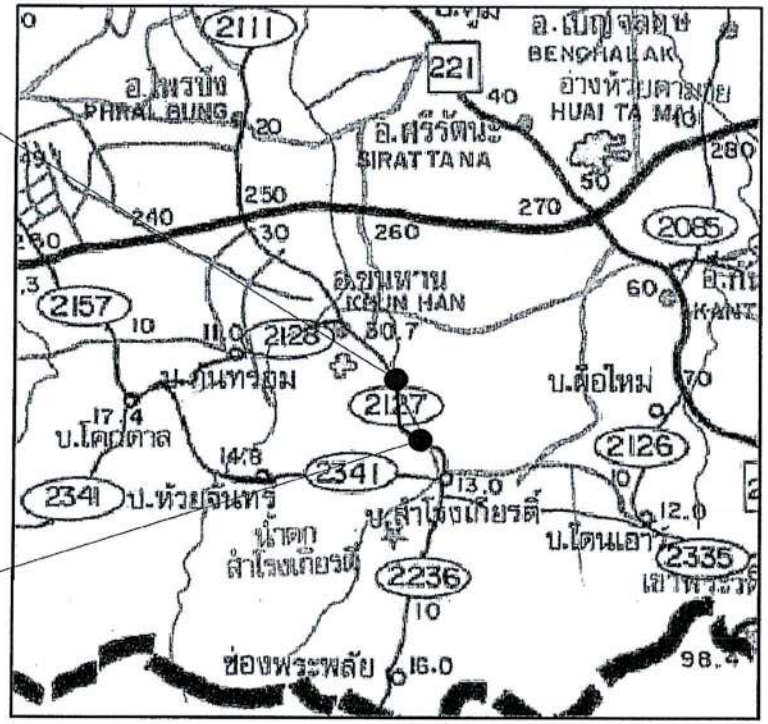

INDEX OF SHEET	SHEET NO.
TITLE SHEET	A
SUMMARY OF QUANTITIES	B
TYPICAL CROSS SECTION	C1–C3
DETAIL	D1–D8
DETAIL OF MEDIAN OPENING	
INTERSECTION DETAIL	
DETAIL R.C. V-SHAPE GUTTER	
TRAFFIC SIGNAL	
แบบแนะนำ SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER	
แบบแนะนำการปรับปรุงเกาะสีเขียวให้เป็นเกาะยก (RAISED MEDIAN) ตามบันทึกที่ ทล1/ผ/3858 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559	
แบบก่อสร้าง BOX CULVERT	
แบบก่อสร้างสะพาน	
แบบขยายความกว้างสะพาน	
แบบ : ป้ายทาวเวอร์ (TOWER SIGN) ขนาดความสูง 8.00 ม.	
แบบ : อาคาร ศาลา ขนาดใหญ่ 4X8 ม. (ภาคอีสาน)	
แบบ : อาคาร ห้องน้ำขนาดกลาง 3X10 ม. (ภาคอีสาน)	
SPECIAL PROVISION FOR STREET LIGHTING	E
SPECIFICATIONS	F1–F2
PLAN & PROFILE	

LIST OF RIGHT OF WAY					
STA. TO STA.	EXISTING		PROPOSED		REMARK
	LT.	RT.	LT.	RT.	
กม.6+200– กม.6+775	8.00	8.00	–	–	
กม.6+775– กม.10+000	15.00	15.00			

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภาคราชกรรณ จำกัด
PHAKRUNGAROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)			
เขียน	ไชยพร ศิล	ไชยพร ทาน	ตรวจแบบ
ออกแบบ		ตรวจ	วันที่ 9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2		18 มี.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9		18 มี.ค. 2566

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	8

SUMMARY OF QUANTITIES

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

SUMMARY OF QUANTITIES

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	REMARK
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	30,260	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,800	
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	200	
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	600	
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	6,330	
6	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	3,070	
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,840	
8	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	3,420	
9	PRIME COAT	SQ.M.	15,000	
10	TACK COAT	SQ.M.	38,050	
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	142	
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,000	
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	38,050	
14	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	12	
15	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	56	
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	48	
17	RELOCATION OF EXISTING GUARDRAIL W-BEAM GUARDRAIL	M.	248	
18	SIGN PLATE 1.2 MM.THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	21	
19	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	75	
20	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	50	
21	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	420	
22	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	1,150	
23	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปแบบที่แสดงนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งด้านเรขาคณิตและโครงสร้าง ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9
2. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบนี้ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสม หรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้
3. ปริมาณที่แสดงไว้ในแบบเป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณที่ถูกต้องให้ถือปริมาณที่ก่อสร้างจริงในสนามปริมาณที่คลาดเคลื่อนไปจากที่แสดงไว้นี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น
4. มิติเป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5. ให้แขวงทางหลวงตรวจสอบสาธารณูปโภค ต้นไม้ ในเขตทางที่อาจเป็นอุปสรรคติดขัดการก่อสร้าง โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไข หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งสำนักงานทางหลวงที่ 9 เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบก่อนที่จะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
6. ให้แขวงทางหลวงตรวจสอบระยะประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาอื่นในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีงานส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถดำเนินการได้ให้แจ้งสำนักงานทางหลวงที่ 9 เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบก่อนที่จะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
7. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาตามแบบเอกสารที่กำหนด

กม.ศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทศรัฐรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	ลัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		ครบ ขส.9
เห็นชอบ	18 ม.ค. 2566 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ทำแหน่งที่ 2				
อนุญาต	18 ม.ค. 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				


ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	C1

TYPICAL CROSS SECTION

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

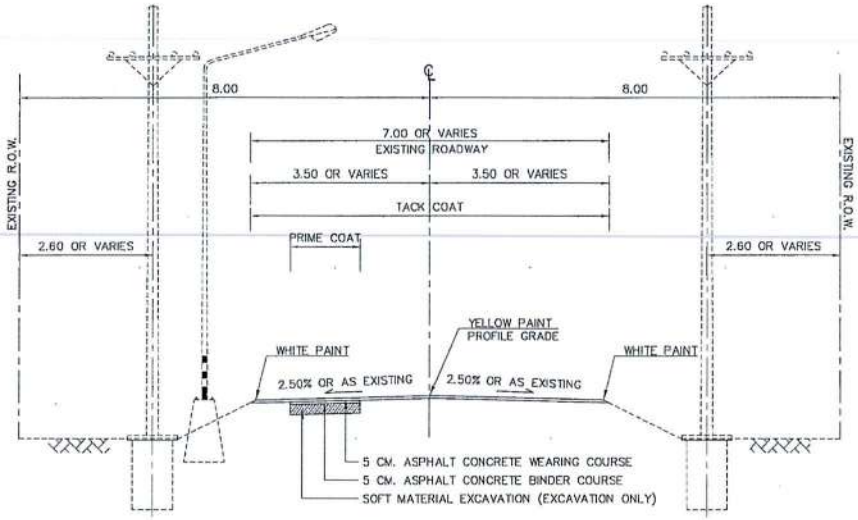

TYPICAL CROSS SECTION I
SCALE 1:100
ระหว่าง กม.6+200 – กม.6+775 (เป็นช่วงๆ)

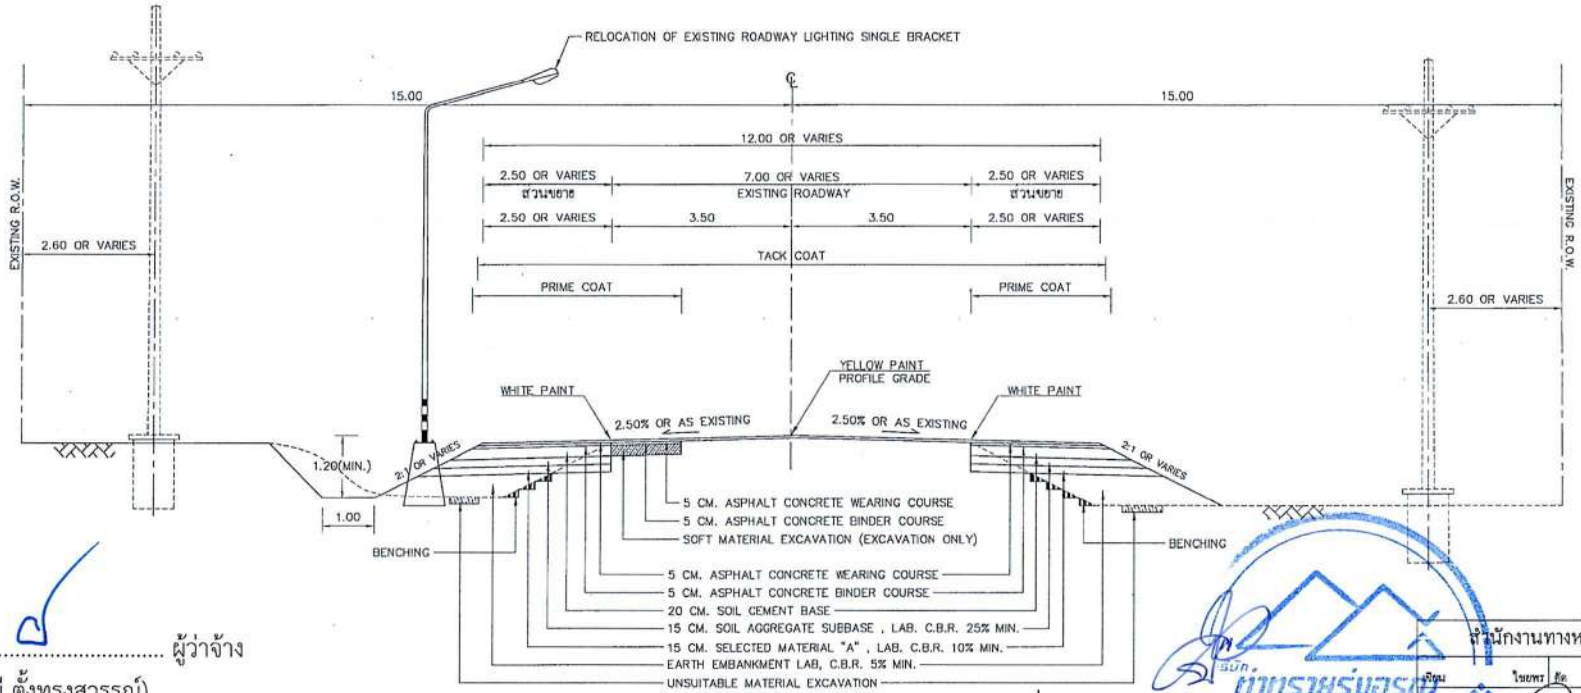

TYPICAL CROSS SECTION II
SCALE 1:100
ระหว่าง กม.6+850 – กม.9+766 (เป็นช่วงๆ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ


หัวหน้างานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

พิจารณา	ไขยหร	ตัด	ไขยหร	ทาน	ถูกนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		วบ.พด.๑
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 ดำแหน่งที่ 2			18 ม.ค.	2566
อนุมัติ	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9			18 ม.ค.	2566

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	C2

TYPICAL CROSS SECTION

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

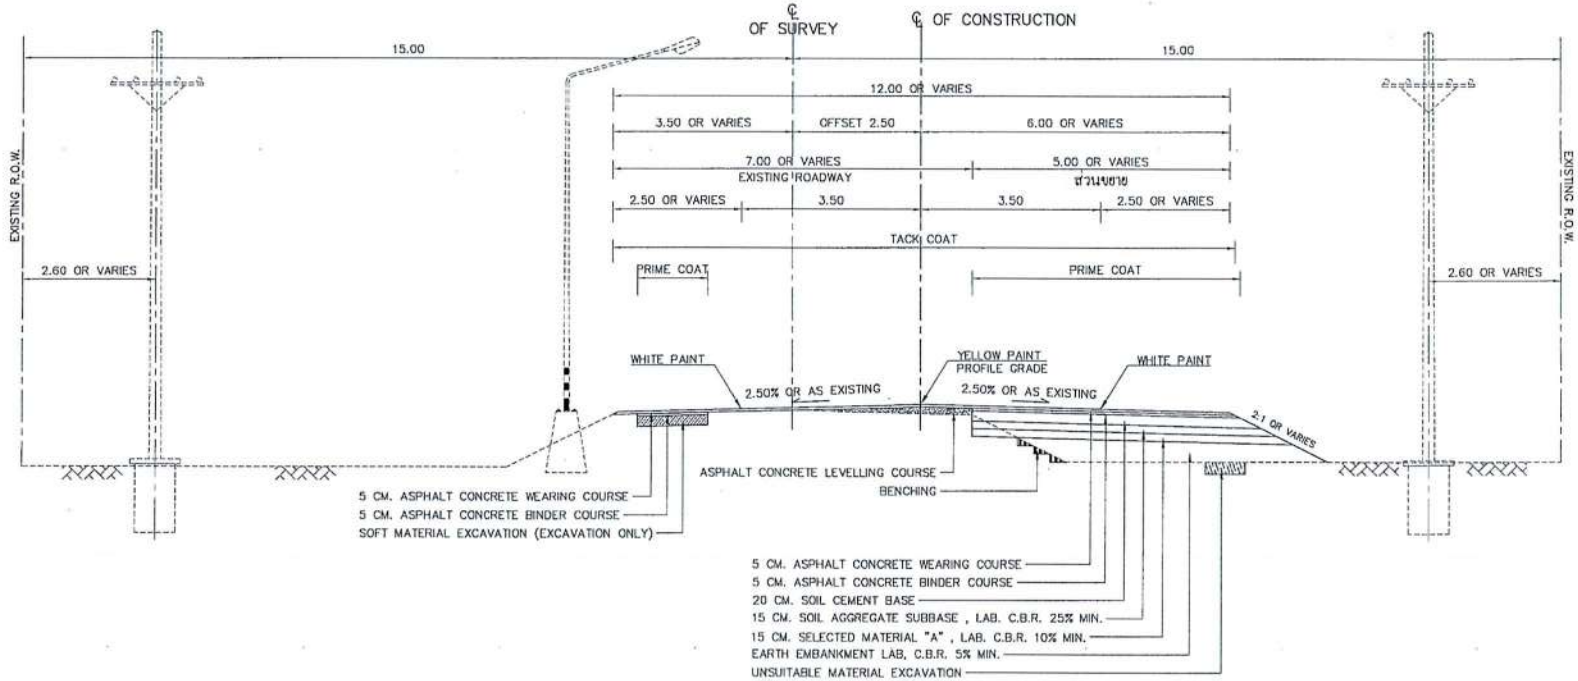

TYPICAL CROSS SECTION III
SCALE 1:100

ระหว่าง กม.8+399.651 – กม.9+541.219 (เป็นช่วงๆ)

กม.๘+๓๙๙

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ทหารผ่านศึก จำกัด
THASARNGARROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	อัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9)			8 มิ.ย.	2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9			18 มิ.ย.	2566

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	C3

TYPICAL CROSS SECTION

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม6+200 – กม10+000

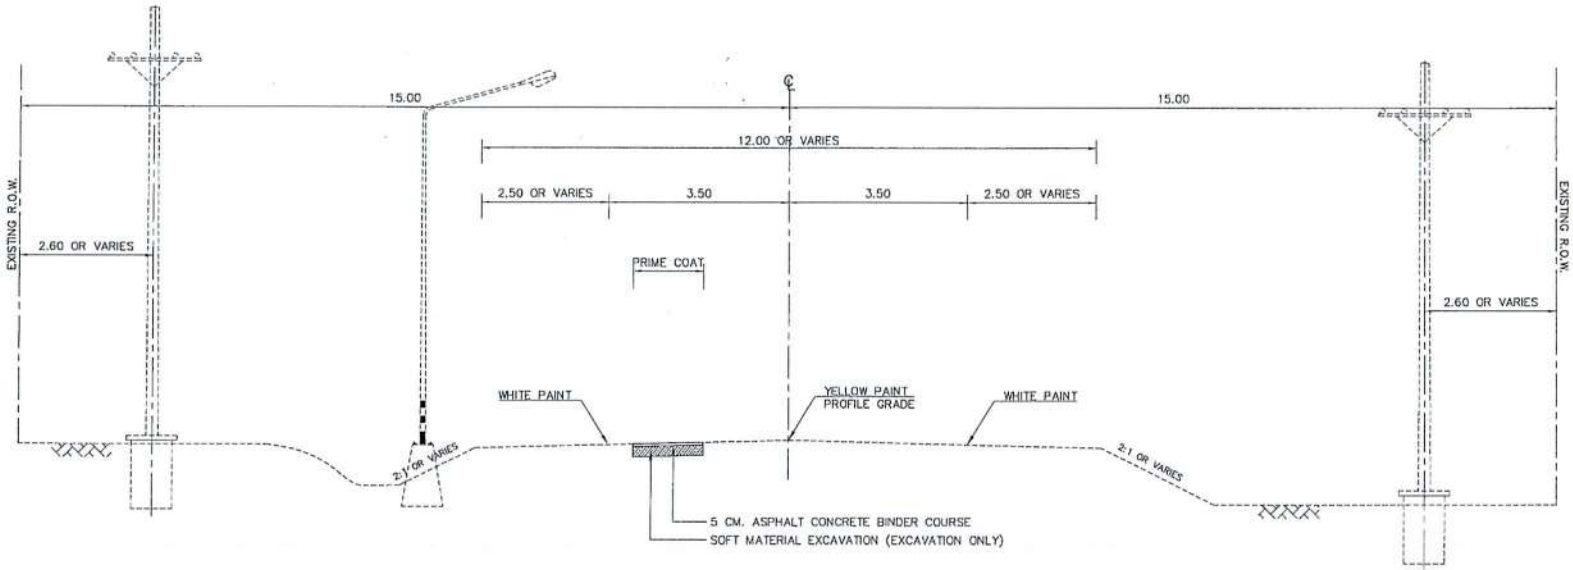


TYPICAL CROSS SECTION IV
SCALE 1:100
ระหว่าง กม9+784 – กม10+000 (เป็นช่วงๆ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภาคีรุ่งอรุณ จำกัด
PAKEE RUNGAROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	ลัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		ณ.ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ทำแหน่งที่ 2		18 มี.ค. 2566		
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9		18 มี.ค. 2566		

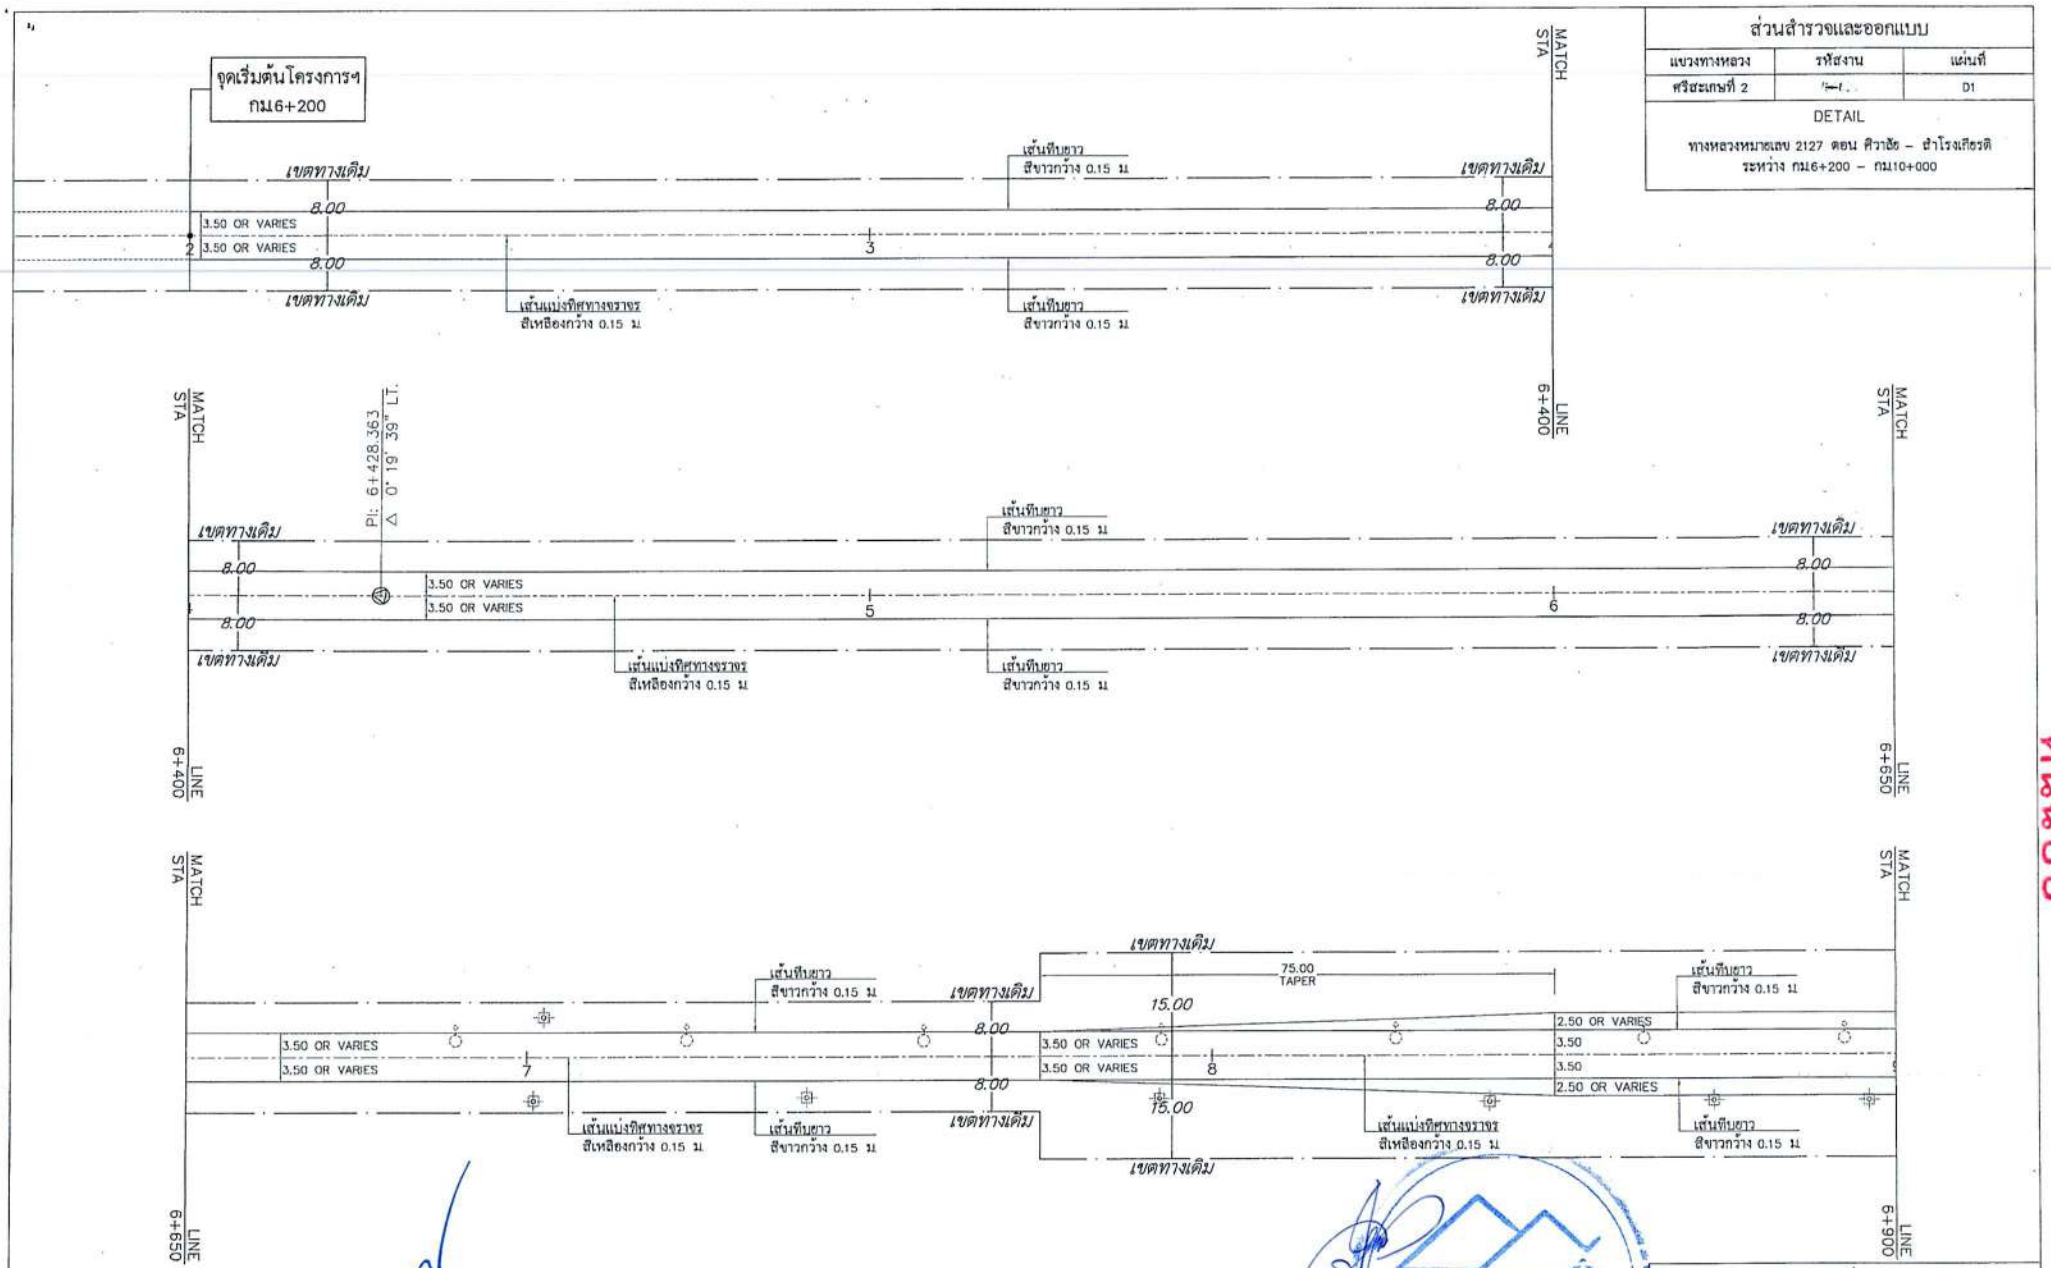

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	D1

DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – ห้วยโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายสิงหรณ์ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	คัด	ไชยพร	ทาน	สุวรรณ
ออกแบบ			ตรวจ		รน.ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ด้านแหน่งที่ 2				18 ม.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 ม.ค. 2566

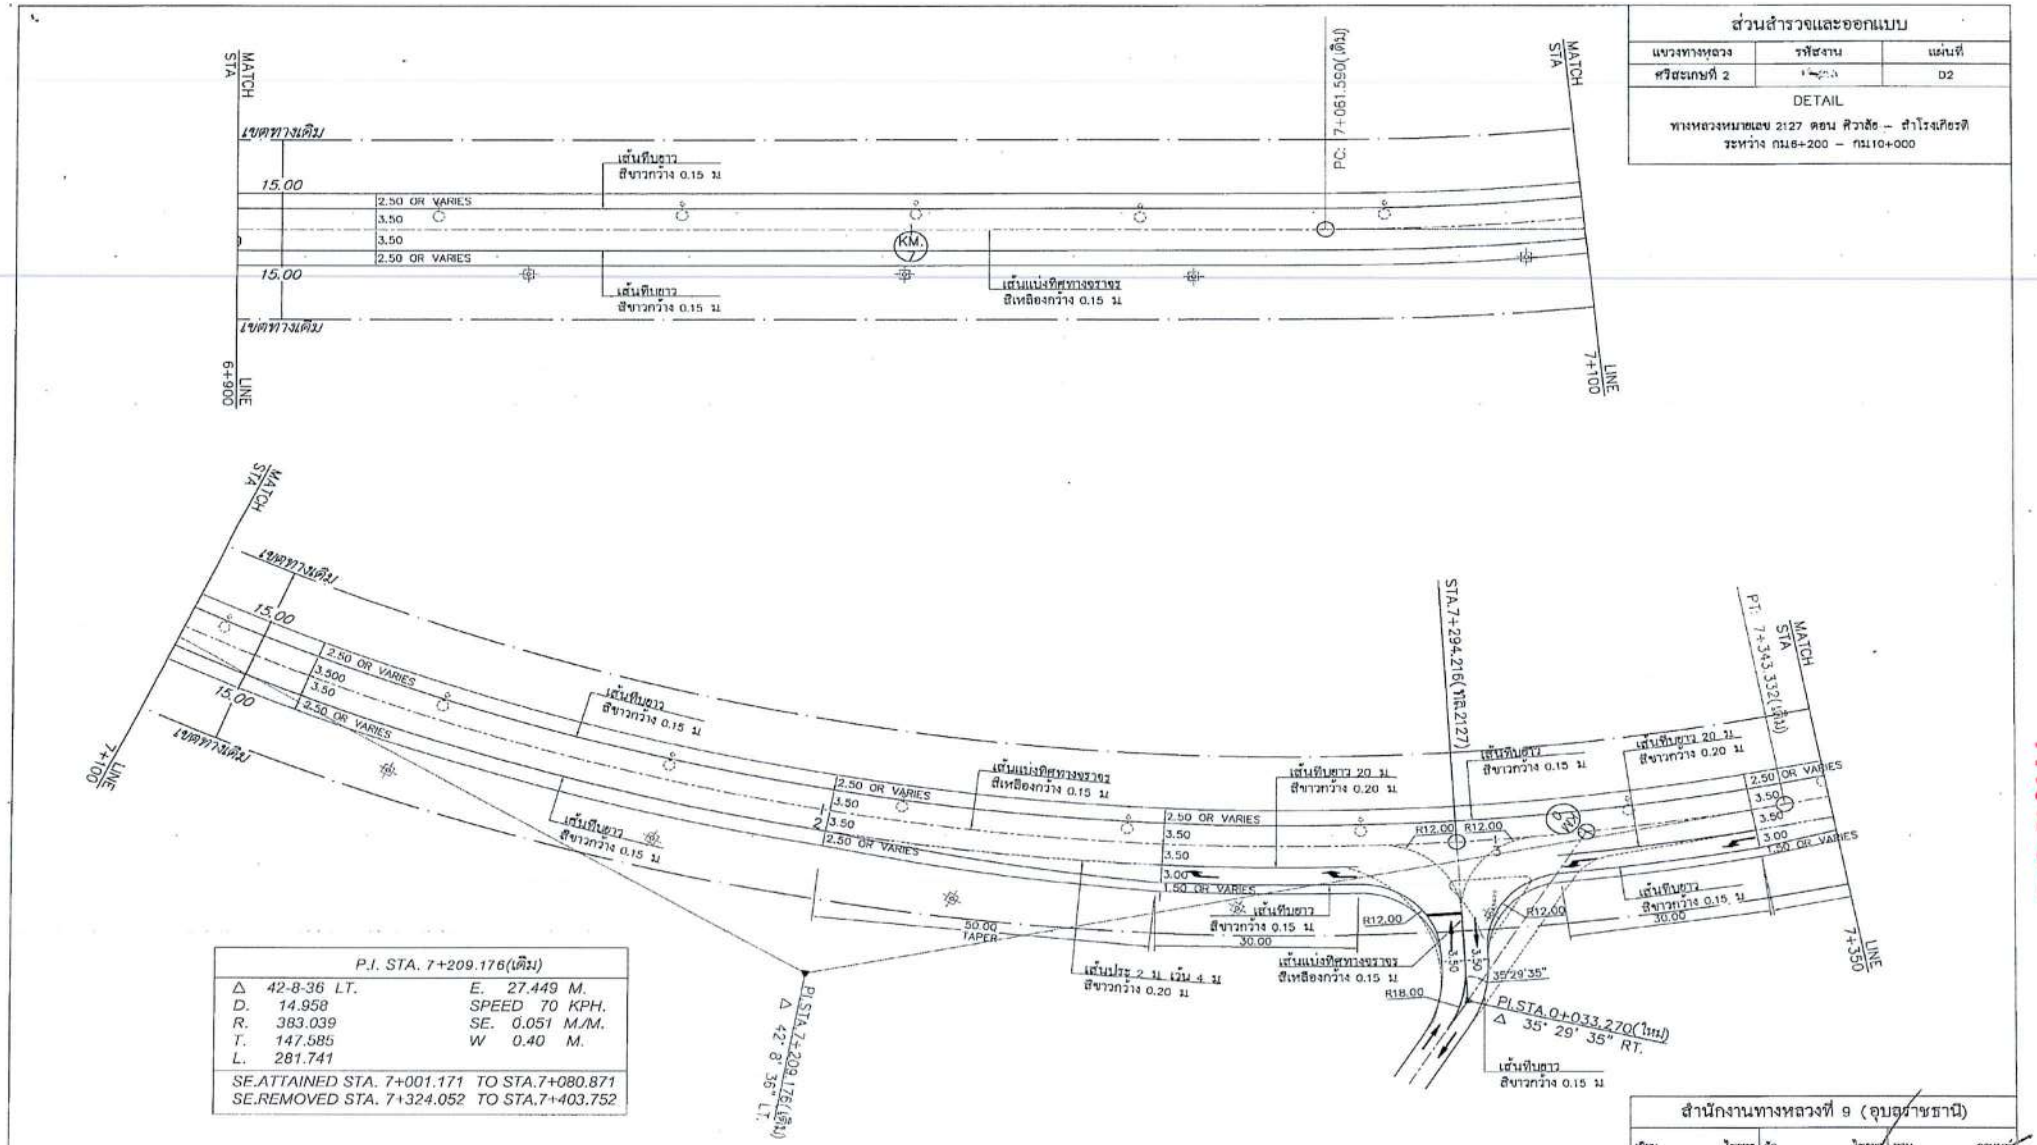

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	D2

DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

P.I. STA. 7+209.176(เดิม)	
Δ 42-8-36 LT.	E. 27.449 M.
D. 14.958	SPEED 70 KPH.
R. 383.039	SE. 0.051 M./M.
T. 147.585	W 0.40 M.
L. 281.741	
SE.ATTAINED STA. 7+001.171 TO STA.7+080.871	
SE.REMOVED STA. 7+324.052 TO STA.7+403.752	

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	ลือ	ไชยพร	ทาน	อุรนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		วนทลง
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่ 2				18 มี.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสีวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทหารช่างรุ่งการุญ จำกัด
RUNGARUN CO.,LTD.


กบสนับ


ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2		D3

DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม16+200 – กม10+000

P.I. STA. 7+566.701(เดิม)			
Δ	3-37-55 RT.	E.	0.930 M.
D.	3.096	SPEED	- KPH.
R.	1,850.713	SE.	- M./M.
T.	58.676	W	- M.
L.	117.314		
SE.ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.REMOVED STA.	-	TO STA.	-

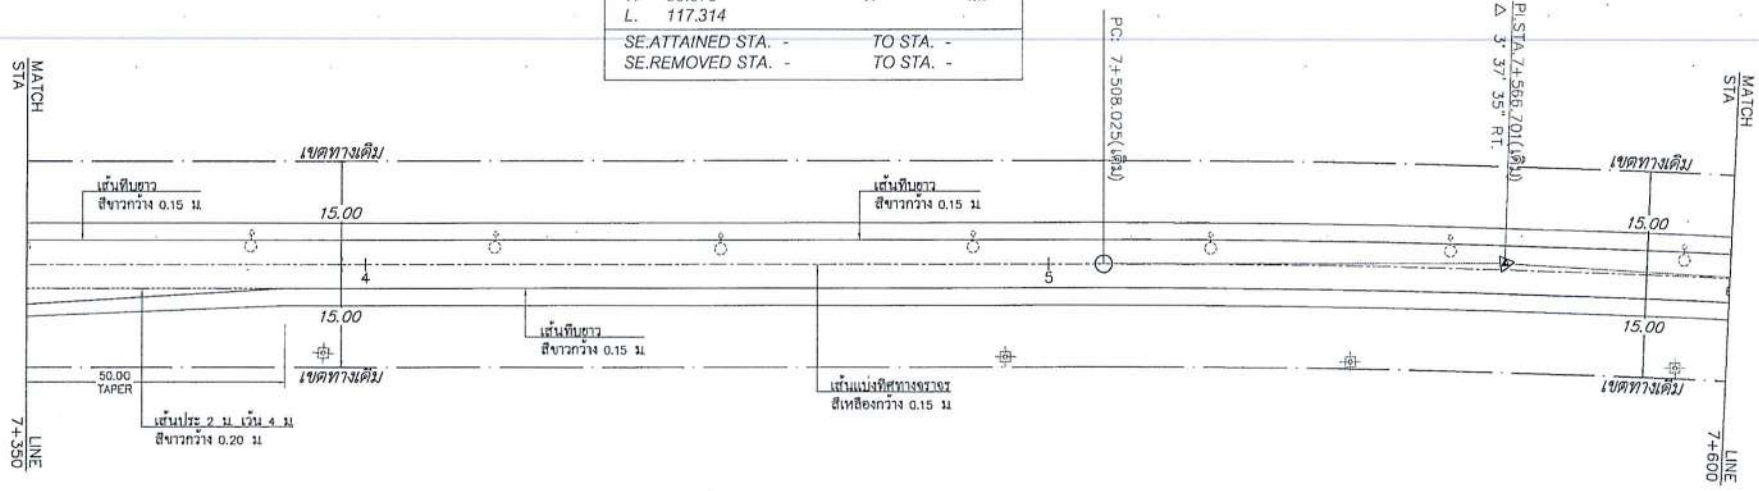

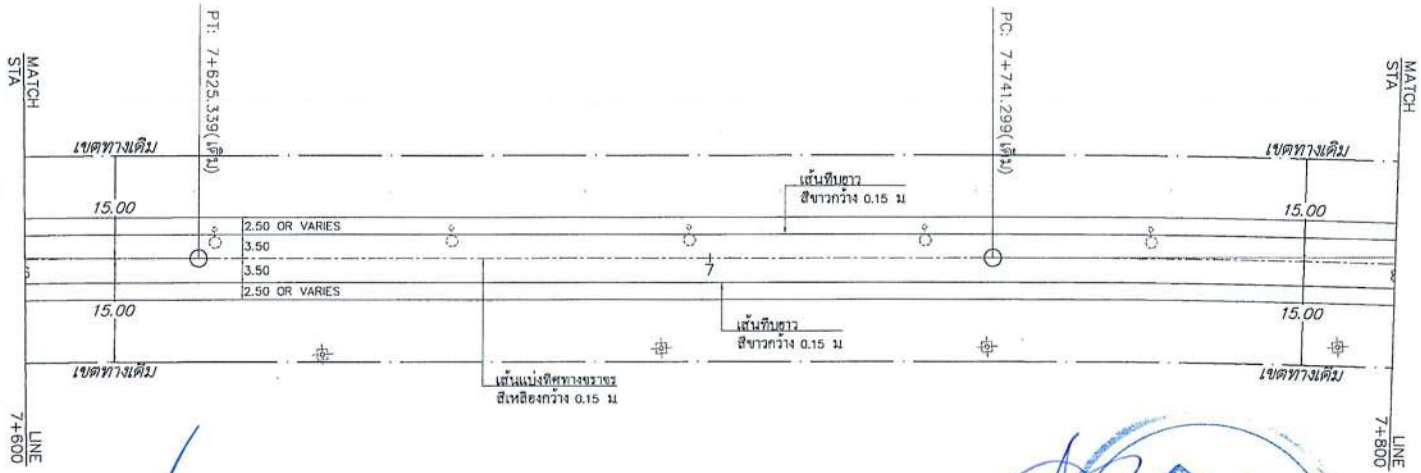

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิวาราชอินทร์ จำกัด
TIWARACHIN KUNGAROON CO.,LTD.


สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	ลัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนนท์
ออกแบบ			ตรวจ		รับทดอ
เห็นชอบ					18 ม.ค. 2566
	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2				
อนุญาต					18 ม.ค. 2566
	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				

กบษนต์

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	D4


DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

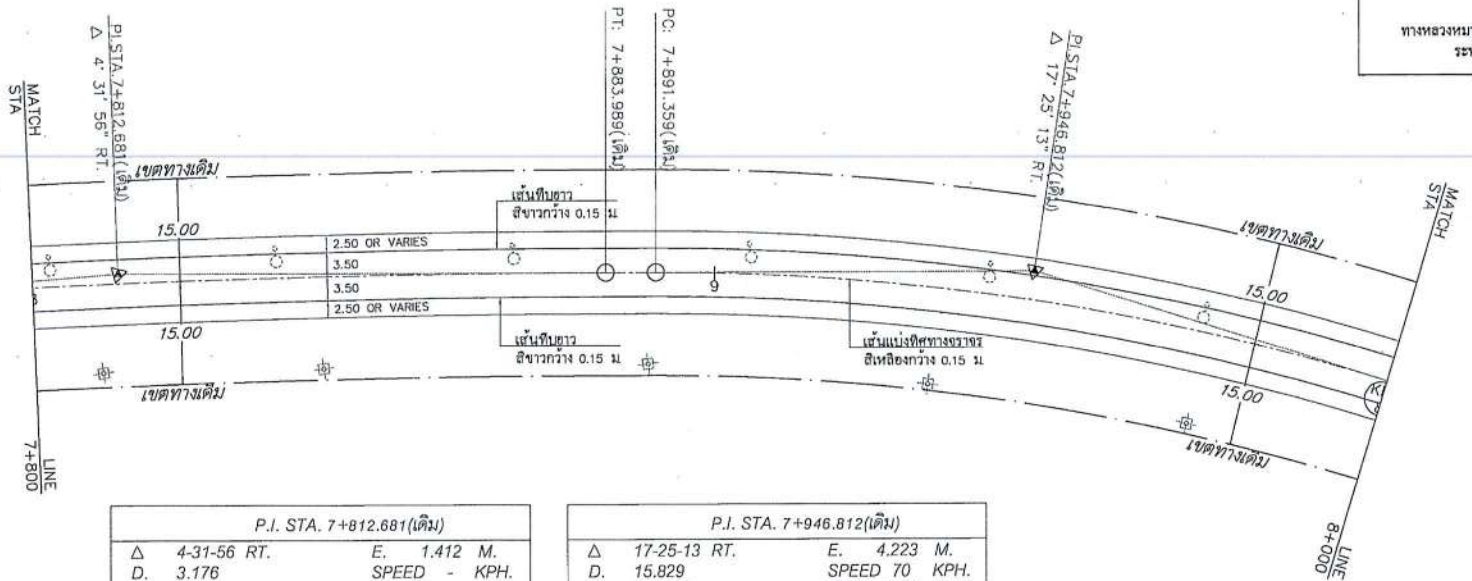

P.I. STA. 7+812.681(เดิม)			
Δ	4-31-56 RT.	E.	1.412 M.
D.	3.176	SPEED	- KPH.
R.	1,803.822	SE.	- M./M.
T.	71.382	W	- M.
L.	142.689		
SE.ATTAINED STA. -		TO STA. -	
SE.REMOVED STA. -		TO STA. -	

P.I. STA. 7+946.812(เดิม)			
Δ	17-25-13 RT.	E.	4.223 M.
D.	15.829	SPEED	70 KPH.
R.	361.962	SE.	0.054 M./M.
T.	55.453	W	0.40 M.
L.	110.051		
SE.ATTAINED STA.7+829.238		TO STA.7+911.778	
SE.REMOVED STA.7+980.990		TO STA.8+063.530	

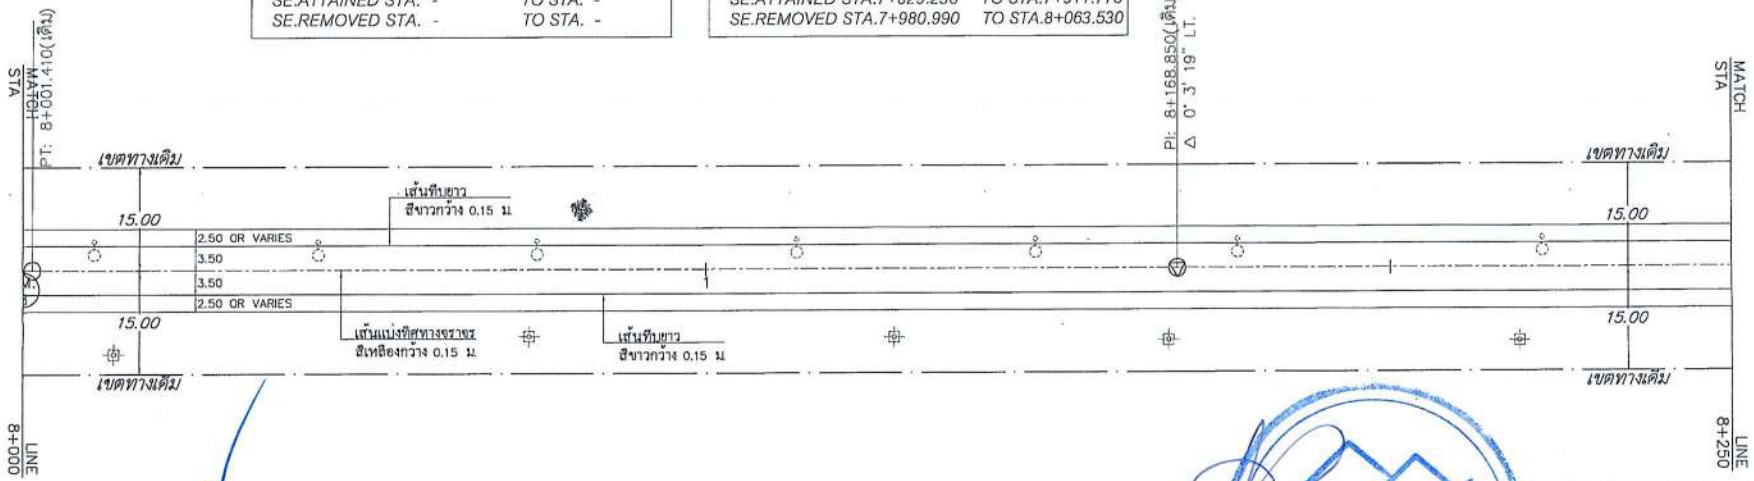

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สุจลิวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายสุวรรณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เจ้าของ	ไชยพร	คัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนาถ
ออกแบบ			ตรวจ		วบ ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่				18 ม.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 ม.ค. 2566


P.I. STA. 8+454.443(เดิม)			
Δ	30-52-4 LT.	E.	6.774 M.
D.	31.645	SPEED	- KPH.
R.	181.058	SE.	- M./M.
T.	49.987	W	- M.
L.	97.544		
SE.ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.REMOVED STA.	-	TO STA.	-

P.I. STA. 8+502.546(ใหม่)			
Δ	49-23-49 LT.	E.	22.527 M.
D.	25.610	SPEED	50 KPH.
R.	223.720	SE.	0.045 M./M.
T.	102.895	W	0.50 M.
L.	192.880		
SE.ATTAINED STA.	8+352.144	TO STA.	8+413.834
SE.REMOVED STA.	8+578.351	TO STA.	8+640.041

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	D5

DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

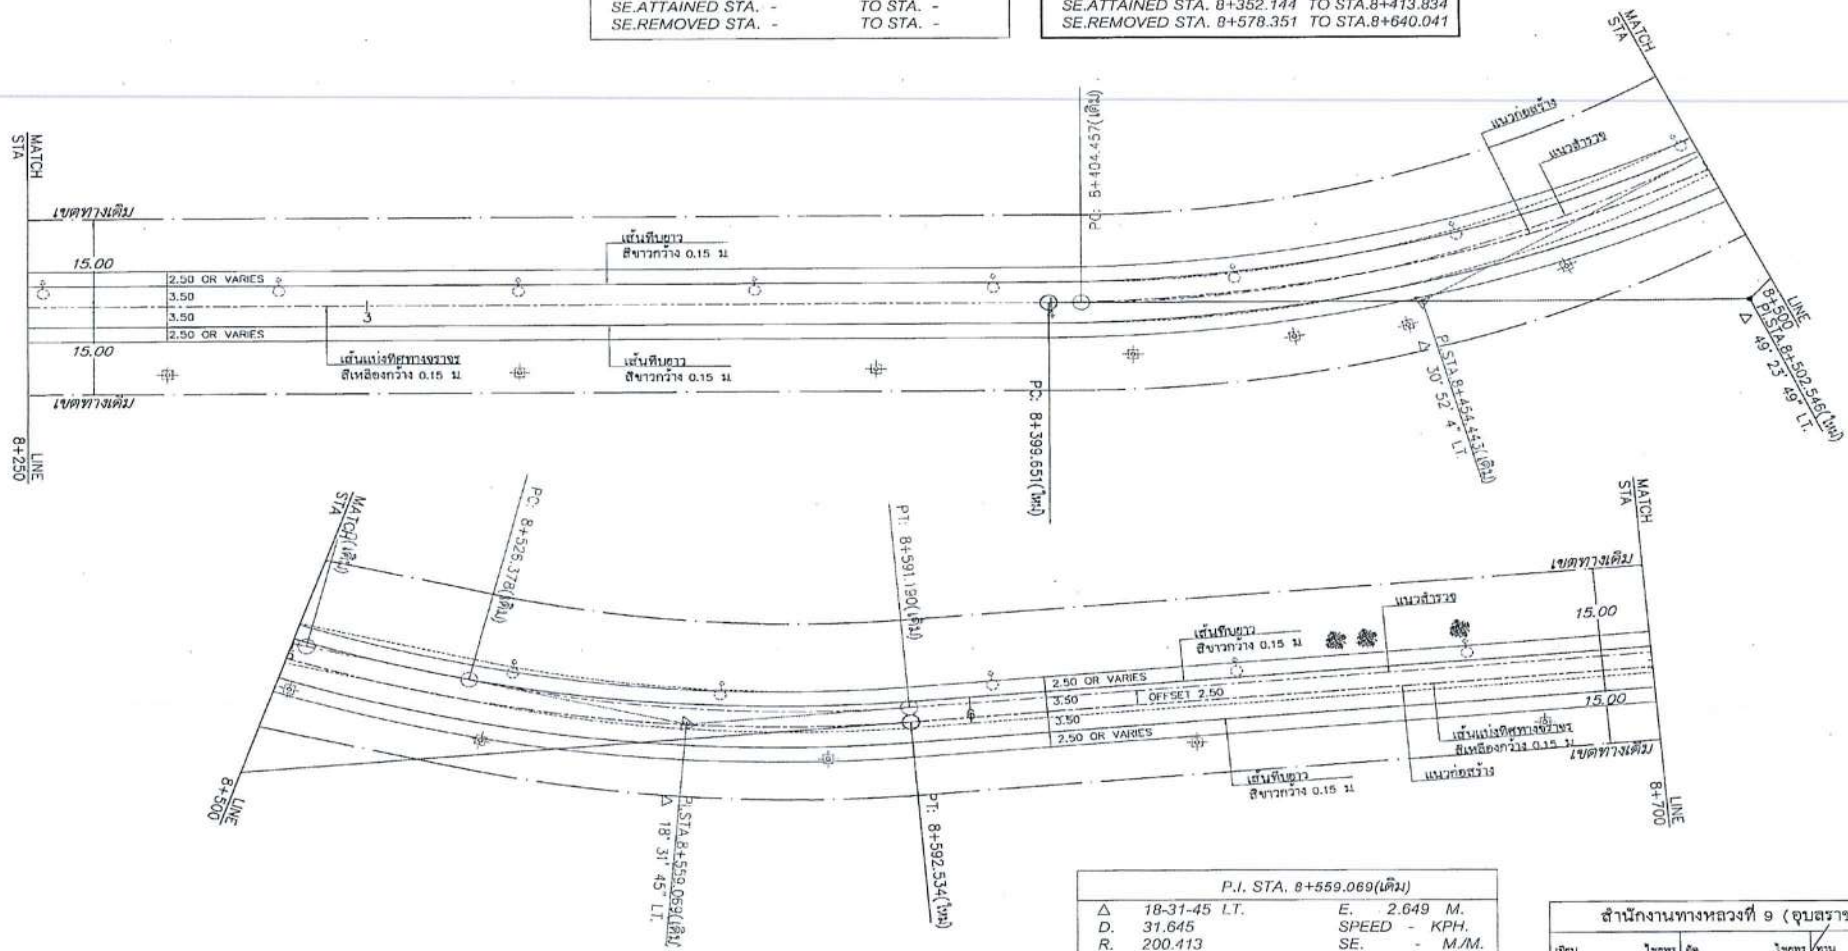

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

P.I. STA. 8+559.069(เดิม)			
Δ	18-31-45 LT.	E.	2.649 M.
D.	31.645	SPEED	- KPH.
R.	200.413	SE.	- M./M.
T.	32.692	W	- M.
L.	64.813		
SE.ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.REMOVED STA.	-	TO STA.	-


สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)			
เขียน	ไชยทร [illegible]	ไชยทร [illegible]	ทาน [illegible]
ออกแบบ	[illegible]	พรพจ	[illegible] ทลอ
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2		18 มิ.ย. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9		18 มิ.ย. 2566


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทหารอาสาพัฒนา จำกัด
THASARUNGAROON CO.,LTD

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	06
DETAIL ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม16+200 – กม10+000		

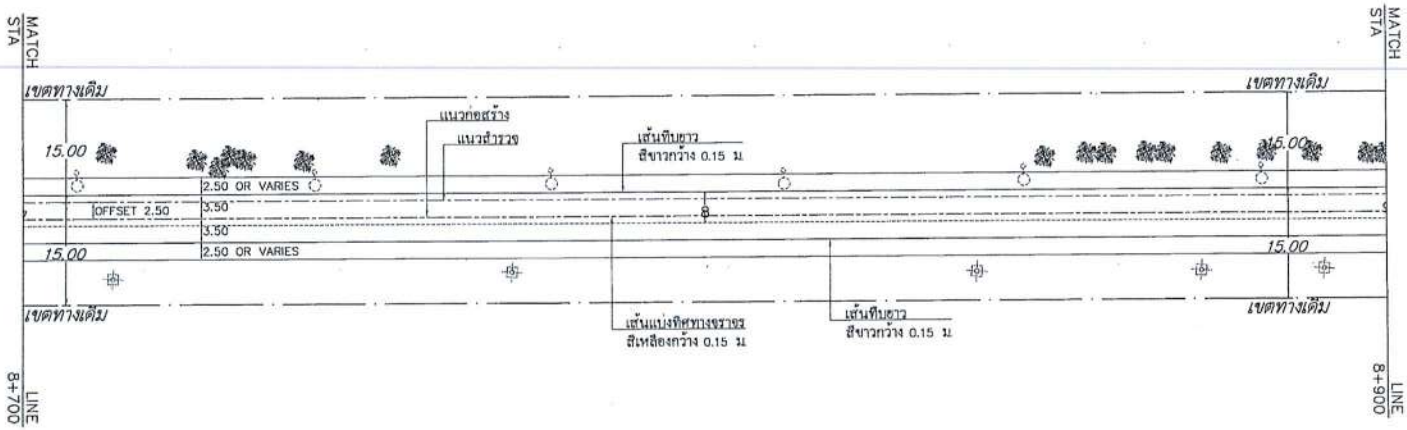

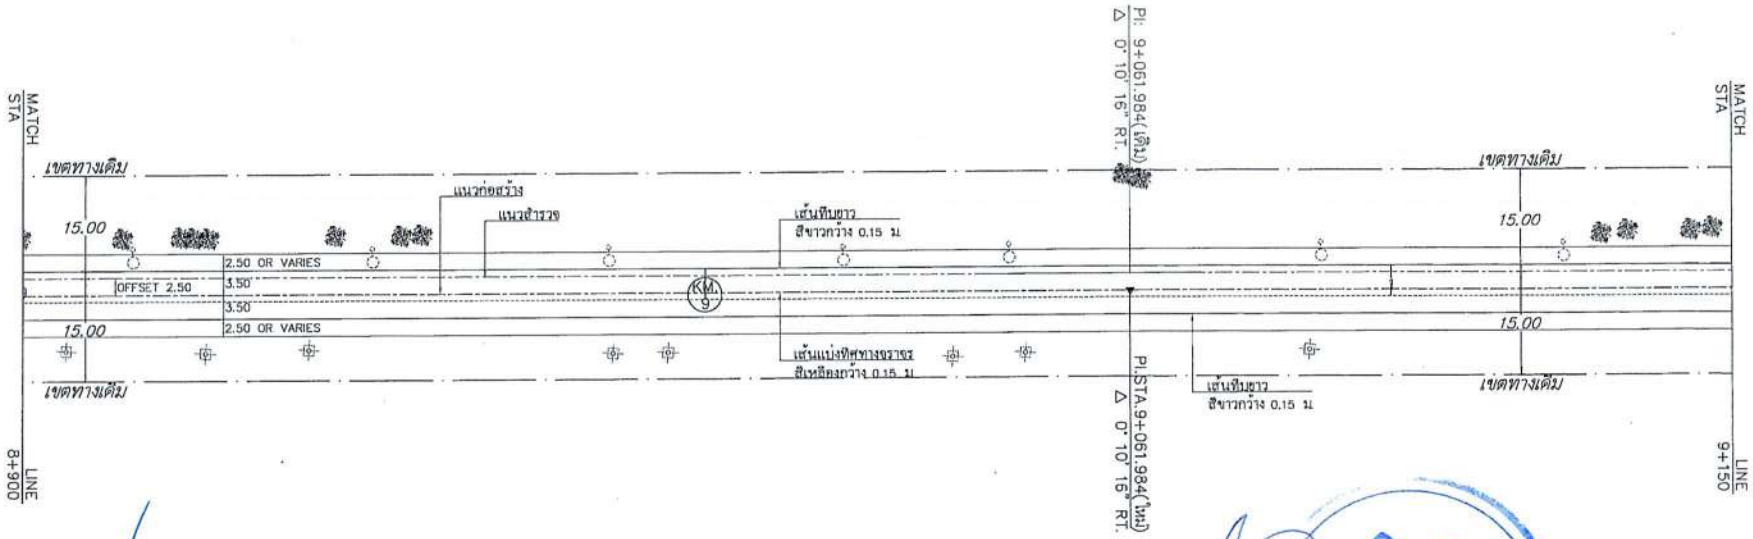

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


เขียน	ไชยพร	ถือ	ไชยพร	ทาน	ภูรินทร์
ตรวจแบบ			ตรวจ		วน.ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2				18 ม.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 ม.ค. 2566

กฤษฎีกา

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	-	07


DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

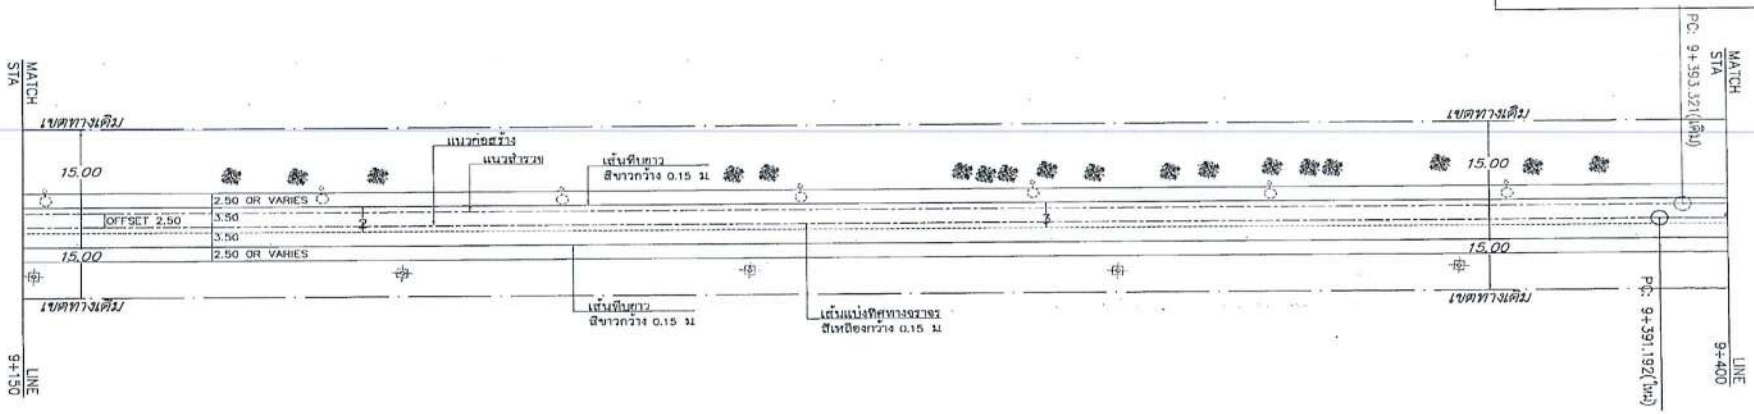

P.I. STA. 9+448.698(เดิม)			
Δ	8-42-45 RT.	E.	2.106 M.
D.	7.882	SPEED	- KPH.
R.	726.930	SE.	- M./M.
T.	55.376	W	- M.
L.	110.539		
SE.ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.REMOVED STA.	-	TO STA.	-

P.I. STA. 9+466.351(ใหม่)			
Δ	8-42-45 RT.	E.	2.859 M.
D.	5.807	SPEED	- KPH.
R.	986.612	SE.	- M./M.
T.	75.155	W	- M.
L.	150.027		
SE.ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.REMOVED STA.	-	TO STA.	-

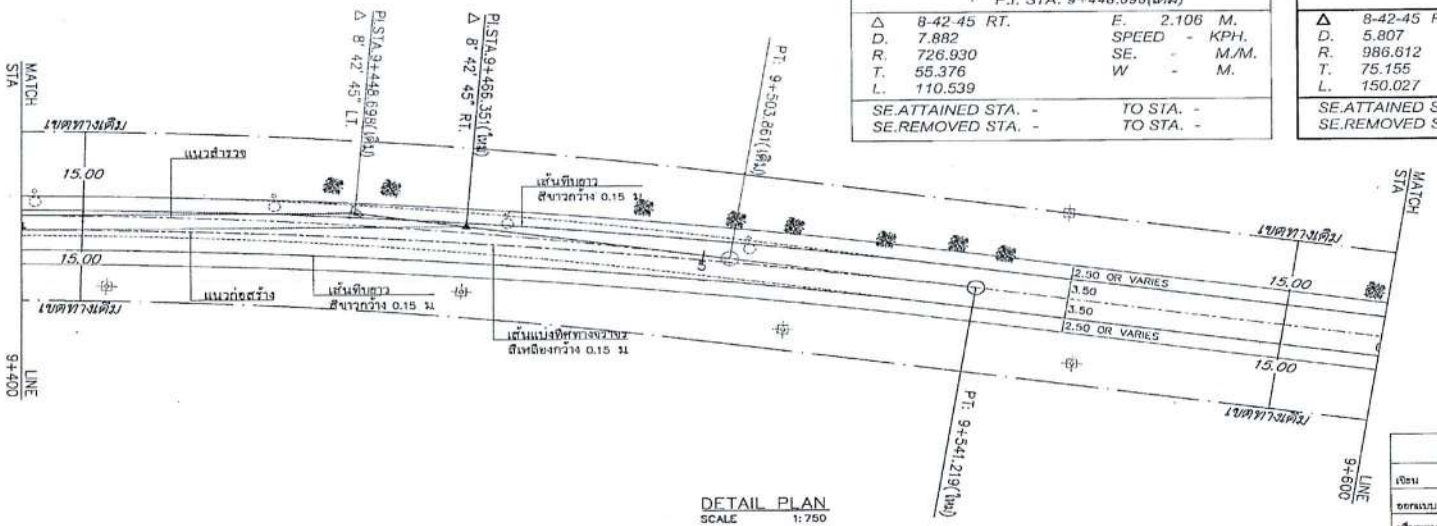

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)			
เขียน	ไชยพร ลิด	ไชยพร ทาน	ถูกแบบที่ 4
ออกแบบ		ตรวจ	วน ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่ 2	18 มิ.ย. 2566	
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9	18 มิ.ย. 2566	


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทหารช่างกุนการูน จำกัด KUNGAROON CO.,LTD.

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	-	D8

DETAIL

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

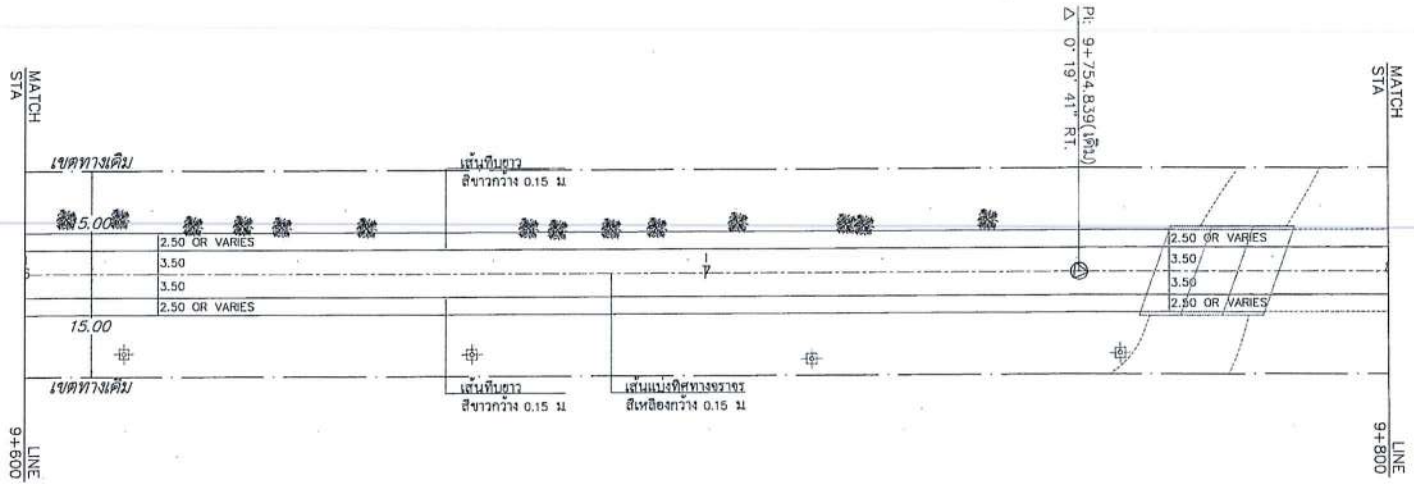

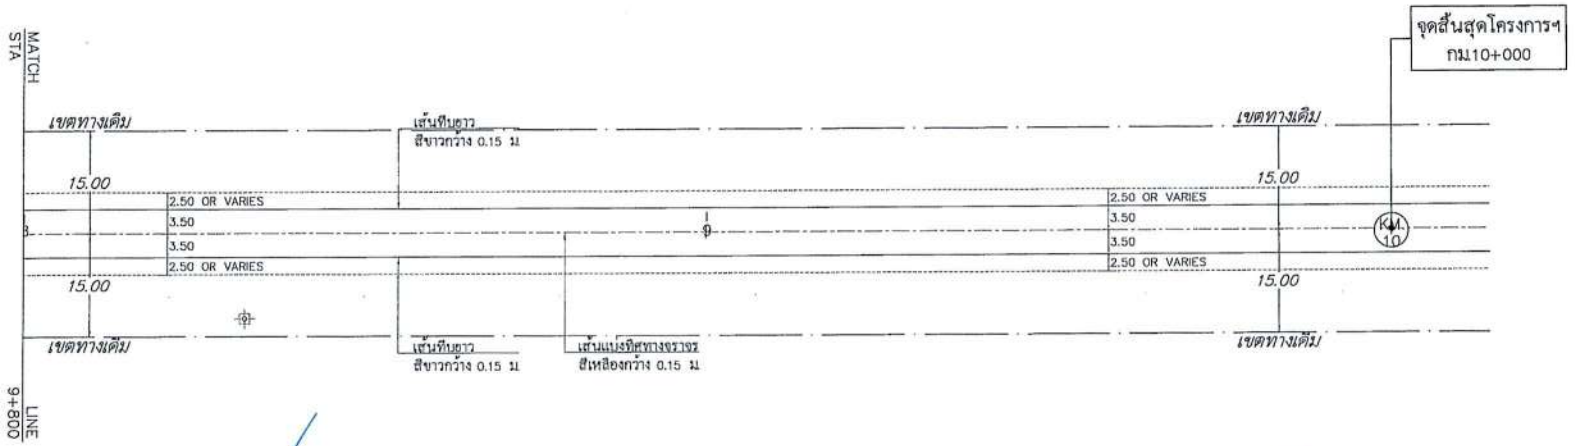

DETAIL PLAN
SCALE 1:750

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ทิพรายรุ่งอรุณ (1993) CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

เจ้าของ	ไชยพร	ตัด	ไชยพร	ทวน	อุบลฯ
ออกแบบ			ตรวจ		วน.พล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่ 2				18 ม.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 ม.ค. 2566

ต้นฉบับ

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	E

SPECIAL PROVISION FOR STREET LIGHTING

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม6+200 – กม10+000

GENERAL NOTE

1. ผู้ประสงค์จะรับจ้าง จะต้องทำการออกแบบและรับผิดชอบในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ประเภทสามัญวิศวกร เป็นอย่างต่ำเป็นผู้ออกแบบหรือตรวจสอบ และลงนามรับรองในแบบดังกล่าว ทั้งนี้ให้แบบสำเนารูปถ่ายบัตรและใบอนุญาต ให้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วย การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (มกราคม 2522) และการออกแบบจะต้องกระทำให้ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องด้วย
2. การเดินสายไฟใต้ดินช่วงข้ามถนน จะต้องเดินสายไฟใน RIGID STEEL CONDUIT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 1/2" และการวางท่อเหล็กจะต้องใช้วิธีดันลอดตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ยกเว้นถนนที่กำลังก่อสร้าง ส่วนการเดินสายไฟจากขอบไหล่ทางไปยังเครื่องวัด จะต้องร้อยสายในท่อเหล็ก RIGID STEEL CONDUIT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/2"
3. ในการดำเนินการติดตั้ง กรณีที่มีความจำเป็น ตำแหน่งของเสาไฟฟ้าไม่สามารถจะติดตั้งได้ตามแบบ ให้ผู้ควบคุมงานปรับตำแหน่งของเสาใหม่โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (มกราคม 2522)
4. ตำแหน่งระยะห่างของเสาไฟตามความยาวของถนน ความสูงของเสา ความยาวของแขนดวงโคม ขนาดของดวงโคม หากผู้ประสงค์จะรับจ้างมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็สามารถกระทำได้ โดยการยื่นแบบรายละเอียด ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้พิจารณาก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะขัดตำแหน่งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง และดวงโคมเป็นลักษณะใดๆก็ตาม จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (มกราคม 2522)
5. ความเข้มของการส่องสว่างในแนวระดับโดยเฉลี่ย (AVERAGE HORIZONTAL ILLUMINATION) บนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21.5 LUMENS/SQ.M.
6. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะรับจ้างออกแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามข้อ 4 ผิดไปจากที่แนะนำให้ไว้แบบที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น ตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องคุมระยะทางของแต่ละขา (LEGS) ได้เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าที่แนะนำไว้ ทั้งนี้ให้ยึดราคารวมของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเป็นสำคัญ
7. เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถปรับความรู้สึกในการมองเห็นดีขึ้น จึงให้เพิ่มระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสองต้นสุดท้าย บริเวณปลายสุดทุกขาที่ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยให้เพิ่มระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแสงสว่างดังนี้ ช่วงริมสุดให้เพิ่มประมาณ 33% ของระยะห่างปกติที่ใช้ช่วงต่อมาให้เพิ่มประมาณ 15% ของระยะห่างปกติที่ใช้ หรือตามที่ระบุไว้ในแบบบริเวณที่กล่าวนี้ ความเข้มของการส่องสว่างจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในข้อ 5

รายการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

1. เสาไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เสา 9.00 ม (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE
2. โคมไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้โคม HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF
3. สายไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด ไม่น้อยกว่า 3x10 MM. NYY
4. การฝังสายไฟฟ้า (BURIAL CABLE) ให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ EE-101 TO EE-113
5. GROUND ROD ให้ใส่ทุกต้น
6. เสาไฟฟ้าแสงสว่างต้นที่ติดตั้งริมไหล่ทาง ให้ถมดินโคนเสาเพื่อรองรับฐานเสา โดยให้ดินที่ถม เท่ากับระดับหลังคันทางขนาด กว้างxยาว 1.50x1.50 ความลาดของดินที่ถม (SIDE SLOPE) 2:1 หรือเท่ากับ SIDE SLOPE ของคันทางเดิมและ COMPACT ให้แน่น (ดูแบบมาตรฐานเลขที่ EE-101 TO EE-113)
7. ให้ทาสีและติดแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม (RETRO-REFLECTIVE SHEET) ที่โคนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ ONE-WAY TRAFFIC DIRECTION สำหรับเสาไฟฟ้าแบบทิ่งเดียว ตามมาตรฐานเลขที่ EE-101 TO EE-113

หมายเหตุ

1. มิติที่ให้ไว้เป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. ตำแหน่งเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่แน่นอน อาจพิจารณาปรับได้ในสนามโดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9

LEGENDS

NEW STREET LIGHTING

RELOCATED STREET LIGHTING

EXISTING STREET LIGHTING

EXISTING STREET LIGHTING (TO BE RELOCATED)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาสายรุ้งอรุณ จำกัด TASAIRUNGAROON CO.,LTD.

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	คัด	ไชยพร	ทาน	ภูวนาถ
ออกแบบ			ตรวจ		วบ.ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2			18 ม.ค. 2566	
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9			18 ม.ค. 2566	

กบ.ชธน.

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	F1

SPECIFICATIONS

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY MATERIALS AND CONSTRUCTION

ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง

ลักษณะงาน	รายละเอียดและข้อกำหนด	มาตรฐานงานทาง (ทล.ม)	แบบมาตรฐานทางหลวง (2015) แบบเลขที่	แบบมาตรฐานทางหลวง (1994) แบบเลขที่
CLEARING AND GRUBBING	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	–	GD–703	–
EARTH EXCAVATION	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	–	–	–
UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	–	–	–
SOFT MATERIAL EXCAVATION	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	–	TS–101	–
EARTH EMBANKMENT	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	102/2532	–	–
EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	วัสดุที่ใช้ต้องเป็นดินที่ปนอินทรีย์วัตถุ มีคุณภาพดีที่จะใช้ปลูกต้นไม้ยืนต้นและหญ้าได้ โดยปราศจากเศษไม้ เศษขยะ หรือเศษก้อนดินที่มีขนาดโตกว่า 25 มม. วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างทางห้ามนำมาใช้	–	GD–709	–
SELECTED MATERIAL "A"	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	208/2532	–	–
SOIL AGGREGATE SUBBASE	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	205/2532	–	–
SOIL CEMENT BASE	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	204/2556	–	–
PRIME COAT	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	402/2557	–	–
TACK COAT	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	403/2531	–	–
ASPHALT CONCRETE	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 1	408/2532	–	–
R.C. PIPE CULVERT	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	DS–101 TO DS–102	–
MEDIAN DROP INLET TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	DS–401	–
R.C. U–DITCH TYPE D	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	DS–603	–
CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	GD–709	–
CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (INCLUDE WIRE MESH) WITH 5 CM. SAND BEDDING (ตัดลายขนาด 40x40 CM.)	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	103/2532	GD–710	–
SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (มีเฟรม/ไม่มีเฟรม)	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. โดยวิธีการตัด – แปะแผ่นสติกเกอร์ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) พื้นป้าย สะท้อนแสงสีต่างๆ ระดับการสะท้อน "แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE"	–	–	–
R.C. SIGN POST	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	RS–101 TO RS–103	
งานไฟฟ้าแสงสว่าง (STREET LIGHTING)	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง	–	EE–101 TO EE–113	–
ป้ายจราจร	คู่มือเล่มที่ 1 คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร คู่มือเล่มที่ 2 คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร ฉบับ มีนาคม 2561	–	RS–101 TO RS–104	–
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 2 เครื่องหมายจราจร (MARKINGS), ข้อกำหนด การขัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) ฉบับ กรกฎาคม 2551	–	RS–201 TO RS–203	–
ทางเชื่อม	อ้างถึง " รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง " เล่มที่ 2	–	GD–704 TO GD–705	–
ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	คู่มือเล่มที่ 3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับ มีนาคม 2561	–	RS–301 TO RS–305	–
แบบรายละเอียดอื่น ๆ	ให้ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 1 ก.พ. 2564	–	–	–

ลักษณะงานก่อสร้างที่ถือเป็นการปรับปรุงแบบ (ไม่ใช่การแก้ไขแบบ)

1. งานวางท่อ
   1.1 การปรับเลื่อนตำแหน่งวางท่อกลม การเพิ่ม – ลด ความยาวท่อกลมจากที่กำหนดในแบบให้เหมาะสมกับสภาพร่องน้ำในสนาม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาทราบโดยเร็ว
   1.2 การเปลี่ยนแปลงขนาดท่อกลม เพิ่ม – ลด จำนวนแถวท่อ กลม เพิ่ม – ลด ตำแหน่งของท่อกลมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานโดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
2. งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (BOX CULVERTS)
   2.1 การปรับเลื่อนตำแหน่งก่อสร้างของท่อเหลี่ยม การเพิ่ม – ลด ความยาวท่อเหลี่ยมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
   2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับก่อสร้าง หรือมุมเฉียง (Skew Angle) ระหว่าง 0 – 30 องศา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
3. งานก่อสร้างสะพาน
   การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก่อสร้าง ,แนวศูนย์กลาง ,ระดับสะพาน ,มุมเฉียง ระหว่าง 0 – 30 องศา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในสนาม ให้ผู้ควบคุมงานเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ 9
4. การปรับแนวทางด้านเรขาคณิต (GEOMETRIC DESIGN)
   โครงการฯสามารถปรับแบบก่อสร้างทางด้านเรขาคณิต ได้แก่ รายการโค้ง ,แก้ไขแนวทางและโค้ง ,ระดับก่อสร้าง เป็นต้น ให้โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
5. งานก่อสร้างเพื่อการระบายน้ำงานทางและงานป้องกันการกัดเซาะ
   การปรับตำแหน่ง ,ระดับก่อสร้างและจำนวนของบ่อพัก (MANHOLE) การปรับความยาวของรางระบายน้ำข้างทาง (SIDE DITCH) และท่อกลมระบายน้ำตามยาว การปรับหรือกำหนดขอบเขตการก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะ กรณีที่แบบไม่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
6. งานสิ่งสาธารณูปโภค
   โครงการฯสามารถปรับตำแหน่งของสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ท่อประปา ,เสาไฟฟ้า ,สายโทรศัพท์ใต้ดิน , บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9 และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสิ่งสาธารณูปโภคนั้นๆ
7. งานอำนวยความปลอดภัยและงานจราจรสงเคราะห์
   7.1 อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น GUARD RAIL, GUIDE POST ปรับระยะตำแหน่งหรือขอบเขตก่อสร้างได้โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
   7.2 ปรับหรือกำหนดตำแหน่งและชนิดของป้ายจราจร และของสีตีเส้นบนผิวจราจรตามแบบมาตรฐานหรือคู่มือของกรมทางหลวงได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
   7.3 การปรับเปลี่ยน เพิ่ม – ลด ชุดติดตั้งป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD OR OVERHANG SIGN) ทำได้โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน และความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
   7.4 การปรับตำแหน่งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทำได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน และความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
   7.5 ปรับตำแหน่งของเสาไฟฟ้าแสงสว่างได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9
8. งานก่อสร้างทางเชื่อม
   โครงการฯสามารถกำหนดจำนวน ลักษณะและขอบเขตของงานก่อสร้างทางเชื่อมสาธารณะได้ตามสภาพความเป็นจริงในสนาม โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยทร	ติด	ไชยทร	ทาน	อุบลฯ
ออกแบบ			ตรวจ		งาน ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2				18 มี.ค. 2566
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9				18 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

กนยชฎ

ส่วนสำรวจและออกแบบ		
แขวงทางหลวง	รหัสงาน	แผ่นที่
ศรีสะเกษที่ 2	[illegible]	F2


SPECIFICATIONS

ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ห้วยสิ – สำโรงเกียรติ
ระหว่าง กม.6+200 – กม.10+000

หมายเหตุทั่วไป :

1. กำลังอัดของแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. เมื่ออายุครบ 28 วัน ตามวิธีการทดสอบที่ ทล.ท. 302/2517 หากมิได้ระบุไว้ในแบบให้ใช้ตาม DWG. NO GN-001 "STRUCTURAL NOTES,GENERAL NOTES-I" สำหรับข้อกำหนดของคอนกรีตรับแรงอัด ผลทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่างที่อายุ 28 วัน จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในกรณีที่ผลทดสอบของคอนกรีตที่มีอายุน้อยกว่า 28 วัน แต่มีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่าค่ากำลังอัดที่ระบุไว้ คอนกรีตนั้นจะถือว่ามีค่ากำลังอัดเทียบเท่ากับการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ที่ 28 วัน
2. ในการพิจารณาก่อสร้างทางเชื่อมสาธารณะที่เกิดขึ้นใหม่ ให้พิจารณาก่อสร้างเท่าที่เหมาะสมและจำเป็นเท่านั้นโดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการขออนุญาตสร้างทางหรือถนน หรือสิ่งยื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นการเข้า–ออกทางหลวง
   2.1 ทางเชื่อมสาธารณะ (SIDE ROAD) คือ ทางเชื่อมที่เชื่อมจากทางหลวงเข้าหมู่บ้านเข้าย่านชุมชน เข้าถนน ซอยที่มีคนอยู่อาศัยมาก (อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานทางหลวงที่ 9), ไปวัด, ไปสถานที่ราชการ, ไปสถานที่สำคัญและทางสาธารณะเพื่อประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้มิได้ใช้กับทางที่ถือเป็นทางหลวง (MAJOR ROAD) เข้ามาตัดจ่ายเงินค่างานให้ดังนี้
      2.1.1 ท่อระบายน้ำลอดทางเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นการต่อความยาวท่อเดิมหรือขยับแนววางท่อ โดยเปลี่ยนขนาดและจำนวนท่อใหม่
      2.1.2 โครงสร้างทาง (PAVEMENT STRUCTURE) ให้ก่อสร้างตามสภาพเดิมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามดุลพินิจของสำนักงานทางหลวงที่ 9
   2.2 ทางเชื่อมเอกชน (PRIVATE DRIVE) คือทางเชื่อมเอกชนที่เข้าบ้านพักอาศัยที่มีรถเข้าออกจ่ายเงินค่างานให้ดังนี้
   กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง
      2.2.1 ท่อระบายน้ำดำเนินการโดยกรมทางหลวงจ่ายเงินค่างานให้
         2.2.1.1 ท่อระบายน้ำดำเนินการโดยกรมทางหลวงจ่ายเงินค่างานให้รายละเอียดเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1.1
         2.2.1.2 กรมทางหลวงจะดำเนินการและจ่ายเงินให้เฉพาะ การก่อสร้างปรับระดับลาดชันของทางเชื่อมให้ ขึ้น–ลง ทางหลวงได้โดยปลอดภัยเท่านั้น ส่วนโครงสร้างทาง (PAVEMENT STRUCTURE) เอกชนผู้ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเอง
      2.2.2 กรณีไม่ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะไม่ดำเนินการก่อสร้างให้ยกเว้นงานก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีความจำเป็นต่อระบบระบายน้ำของกรมทางหลวงเป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น โดยความเห็นชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 9 และให้เอกชนดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวงต่อไปหรือมิฉะนั้นให้แขวงทางหลวงที่รับคำขอยับ
3. การพิจารณาว่าถนนเดิม SOFT หรือไม่ให้ใช้รถบดชนิดใดก็ได้ ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6 เมตริกตัน วิ่งผ่านและสังเกตุในระยะใกล้ถ้าถนนเดิม SOFT จะสังเกตุเห็นการขุบตัว (MOVEMENT)
4. ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานสำรวจขุดย่อนตัวบนทางเดิมตามวิธีการที่ได้กำหนดในข้อ 3 ให้ตอยอดโครงการฯ และจัดทำบัญชีไว้ แล้วแจ้งให้แขวงทางหลวงทราบ โดยส่งสำเนาให้สำนักทางหลวงที่ 9 และให้ถือปริมาณงานขุดย่อนตัว ที่ได้สำรวจไว้นี้เป็นบรรทัดฐานในการจ่ายค่างาน
5. ระหว่างการก่อสร้างขยายไหล่ทางที่ต้อง BENCHING เข้ามาถึงขอบพื้นทางเดิมจะต้องลงวัสดุเสริมทันที เพื่อป้องกันพื้นทางเดิมปริเวณตามแนว BENCHING เกิดการ CRACK เนื่องจากขาด LATERAL SUPPORT
6. ส่วน 'A' ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน ส่วน 'B' กว้างพอที่เครื่องจักรบดทับดินสามารถทำงานได้
7. ห้ามขุด SIDE BORROW ในเขตทาง
8. ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณารักษาต้นไม้ยืนต้นให้คงสภาพเดิมไว้
9. การคิดราคา ท่อกลม คสล. ให้ผู้รับจ้างคิดราคางานรื้อท่อกลม คสล. เดิมออกด้วย ในการรื้อท่อกลม คสล. เดิม ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ท่อกลม คสล. เดิมที่รื้อออกจะต้องนำไปเก็บไว้ที่แขวงทางหลวงหรือบริเวณที่ผู้ควบคุมงานระบุ
10. บริเวณใดจำเป็นต้องวางท่อกลม คสล. เพิ่มเติมเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ 9
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมความยาวท่อกลม, ท่อเหลี่ยม ที่กำหนดไว้ในแบบเพื่อความถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในสนามให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำ
12. ในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจตำแหน่งสาธารณูปโภคต่างๆ และระมัดระวังเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ หากเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
13. ในกรณีที่ต้องก่อสร้าง MEDIAN OPENING ให้ผู้ควบคุมงานกำหนดในระหว่างทำการก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9
14. แนวทางราบและแนวทางตั้ง ตามที่กำหนดไว้ในแบบแผนที่และแนวทาง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาปรับได้ในสนามตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9
15. แบบรูปและรายการละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบนี้ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดในบัดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกปัญหาและแนวทางแก้ไข เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยพลัน หากจำเป็นต้องแก้ไขแบบให้เสนอความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตั้งแต่เมื่อเริ่มสัญญาเพื่อมิให้เกิดปัญหาความล่าช้าของงาน


BENCHING DETAILS




GENERAL RECOMMENDATION FOR FILL OR CUT SLOPE CONSTRUCTION

HEIGHT OF FILL OR CUT (M.)	FILL SLOPE EARTH	CUT SLOPE			REMARK
		EARTH	SOFT ROCK	HARD ROCK	
0.00 – 3.00	2 : 1	1 : 1	0.50 : 1	0.25 : 1	THE SLOPE RATIO AS SHOWN IN THIS TABLE IS THE PROPORTION OF HORIZONTAL DISTANCE TO VERTICAL DISTANCE.
3.01 – 5.00	1.5 : 1				
> 5.00	SEE TYPICAL CROSS SECTION FOR DEEP CUT AND HIGH FILL (DWG. NO. TS-401)				


SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT



SECTION

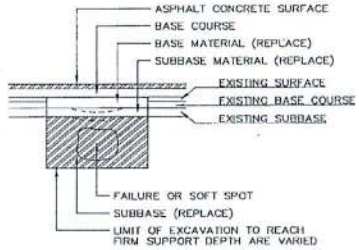

(ON EXISTING ROAD)



(OVERLAY SECTION)

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)					
เขียน	ไชยพร	คัด	ไชยพร	ทาน	อุบลพร
ออกแบบ	[illegible]		ครอง	[illegible]	แผ่นที่ ทล.9
เห็นชอบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2			18 มี.ค. 2566	
อนุญาต	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9			18 มี.ค. 2566	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสวน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศิริรุ่งอรุณ จำกัด SIRIRUNGAROON CO.,LTD.

กบชนา

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/ ๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง

SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION

เล่มที่ ๑

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

BANGKOK ๑๐๔๐๐, THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/ ๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง

SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION

เล่มที่ ๒

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

DEPARTMENT OF HIGHWAYS, MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

BANGKOK ๑๐๔๐๐, THAILAND

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARODN CO.,LTD.

ข้อ 2.3 ผนวก 3

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

แนบสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม.10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร

1. รายละเอียดของงาน ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	รายละเอียดและข้อกำหนด
1.	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	30,260.00	3.95	119,527.00	ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
2.	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,800.00	58.95	224,010.00	กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND
3.	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	200.00	64.95	12,990.00	CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 1 ก.พ. 2564
4.	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	600.00	64.95	38,970.00	และหรือที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
5.	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	6,330.00	202.80	1,283,724.00	
6.	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	3,070.00	275.80	846,706.00	
7.	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,840.00	356.75	1,013,170.00	
8.	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	3,420.00	779.45	2,665,719.00	
9.	PRIME COAT	SQ.M.	15,000.00	48.95	734,250.00	
10.	TACK COAT	SQ.M.	38,050.00	15.98	608,039.00	
11.	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	142.00	3,201.50	454,613.00	
12.	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,000.00	383.74	5,756,100.00	
13.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	38,050.00	383.74	14,601,307.00	
14.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	12.00	1,347.00	16,164.00	
15.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	56.00	2,147.00	120,232.00	
16.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	48.00	3,019.00	144,912.00	
17.	RELOCATION OF EXISTING GUARDRAIL W-BEAM GUARD RAIL	M.	248.00	230.00	57,040.00	
18.	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	21.00	3,507.00	73,647.00	
19.	R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	M.	75.00	540.25	40,518.75	
20.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	50.00	10,827.25	541,362.50	
21.	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	420.00	391.50	164,430.00	
22.	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	1,150.00	391.50	450,225.00	
23.	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	7,843.75	7,843.75	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,975,500.00	(เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ผู้ชนะ

2. ภายในระหว่าง กม. ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการจ้างเหมาในตอนใด กว้างใด หรือเว้น ตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Scheduale) ให้เป็นที่พอใจ ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0505/ว.27 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

4.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมตวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

4.3 ลักษณะงานก่อสร้าง

4.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

บริษัท ทาสายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 301 TO RS - 305 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

~~7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมือ (ทดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยที่ 1 และที่ 2) และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3) หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา~~

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการและได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจร ตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณจราจรและมีโคมไฟแสดงสัญญาจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจร ที่ 1/2547 เรื่อง การขุดหลุม งานปลูกปักหรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาสายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

กันยายน

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรการปรับราคา

.....

๑. วัสดุที่ใช้ตามนัยแห่งสัญญานี้ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุ ณ แหล่งที่มีคุณภาพที่ **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** ได้ทดลองเห็นชอบแล้ว ซึ่งอาจหาได้จากแหล่งวัสดุ.....-.....

การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะนำไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเพื่อปัดความรับผิดชอบใด ๆ ของตนไม่ได้ การสืบแสวงหาแหล่งวัสดุตามสัญญาเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาตามคุณภาพและลักษณะที่กำหนด

ในการตรวจทดลองคุณภาพวัสดุตามรายละเอียดสัญญาแนบท้ายนี้ **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งมาให้ตรวจทดลอง

๒. บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้ ตลอดจนวัตถุระเบิด ถ้าต้องใช้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้น

๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** มีสิทธิที่จะหักเงินค่างาน ของผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าจนครบจำนวน

๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระที่จะต้องชดใช้หนี้สินหรือภาระอื่นใดตามสัญญาจ้าง **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** จะต้องหักเงินค่างานที่มีอยู่ ชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญานั้นเสียก่อน หากมีเหลือเท่าใด จึงจะนำมาชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

๕. ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญานี้

๕.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** มีสิทธิเรียกร้องเงินที่จ่ายล่วงหน้าจากผู้ค้ำประกันได้

๕.๒ ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันลดลงตามส่วน ตามจำนวนเงินที่ **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** ได้หักชดใช้จากเงินค่างานของผู้รับจ้าง

๕.๓ การหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้านี้ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมีหนี้สินหรือภาระอื่นใดต่อ**จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** ตามสัญญาจ้างที่ไม่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างล่วงหน้า **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** มีสิทธิที่จะหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญาจ้างนั้นก่อน เมื่อมีเงินเหลือจึงจะหักชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

๖. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กล่าวนี้กับรายละเอียดอื่น ๆ จะได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือสัญญาค้ำประกันแล้วแต่กรณี

๗. งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ ผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเงินค่างานให้ตามที่กำหนดไว้ในรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๒

ส่วนงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน การจ่ายค่างานจะแบ่งจ่ายได้ดังต่อไปนี้

๗.๑ ก่อสร้างตอม่อทุกต้น พร้อมบันไดขึ้น – ลง ให้จ่ายได้	๔๕ %
๗.๒ ก่อสร้างคานพร้อมพื้นสะพานและราวสะพาน ให้จ่ายได้	๔๐ %
๗.๓ ก่อสร้างราวบันได รายการละเอียดต่าง ๆ พร้อมการตกแต่งงานทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบและสัญญาทุกประการ ให้จ่ายได้	๑๕ %
รวม	๑๐๐ %

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีจันทร์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศสายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดทำ และติดตั้งป้ายเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรชั่วคราว ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และตามแนวทางปฏิบัติการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ สำหรับการจัดซ่อมถนน และงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติกำหนดไว้ เพื่อให้ความสะดวกและความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้าในบริเวณงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างอาจให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในวรรคแรก เมื่อเห็นว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การก่อสร้างสะพานบริเวณที่มีสะพานเดิมอยู่ก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำสะพานเบี่ยงหรือทางเบี่ยงตามแบบเลขที่ S๕/๐๕-๑ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะขนาด H๒๐-๔๔ ได้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความจำเป็น พร้อมทั้งต้องตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีแข็งแรงและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งานอยู่

สะพานเดิมส่วนที่เป็นไม้ หรือส่วนที่เป็นเหล็ก ผู้รับจ้างจะต้องจัดการรื้อออกนำส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ณ ที่ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้ทราบ การรื้อตอม่อสะพานซึ่งเป็นไม้ตลอด ให้ใช้วิธีตัดเสาเสมอระดับดิน ถ้าเป็นไม้ต่อคอนกรีตให้ถอนส่วนที่เป็นไม้ออก สำหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตของสะพานเดิมทั้งหมดที่มิใช่ส่วนประกอบโครงสร้างใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดการรื้อออกให้เป็นสมบัติของผู้รับจ้าง

สะพานเบี่ยงหรือทางเบี่ยงซึ่งผู้รับจ้างจัดสร้างขึ้น ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายรื้อออกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ในเมื่อได้ทำการสร้างสิ่งก่อสร้างตามประกาศนี้เสร็จ เปิดการจราจรได้แล้ว

๙. งานรายนี้เป็นงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒** จะรับทำสัญญาผูกพันกับผู้ใดต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ทำสัญญาได้

๑๐. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกบนทางหลวง ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

๑๑. ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างหรือจัดหาสำนักงาน และที่พักชั่วคราว ดังนี้.-

๑๑.๑ .....

๑๑.๒ .....

๑๑.๓ .....

๑๑.๔ .....

๑๑.๕ .....

๑๑.๖ .....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สุลีจันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศไรยรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ในกรณีที่ต้องจัดหาสำนักงาน และที่พักชั่วคราวผู้รับจ้างจะต้องจัดหาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตลอดจนน้ำอุปโภคบริโภคตามควรแก่กรณี อนึ่ง สถานที่ที่จะก่อสร้างหรือจัดหาสำนักงาน และที่พักชั่วคราว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิคอัพขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี ที่มีสภาพใช้งานได้ดี โดยเป็นรถยนต์ใหม่หรือจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยนับถึงวันเริ่มทำงานตามสัญญา จำนวน.....-.....คัน พร้อมพนักงานขับให้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ**จังหวัดศรีสะเกษ** ในการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหรือสะพาน ตามสัญญา ตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของพนักงานขับทั้ง.....-.....คน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของ**จังหวัดศรีสะเกษ** หรือ**จังหวัดศรีสะเกษ** และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/๙๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗ **จังหวัดศรีสะเกษ**สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือร่างสัญญาตามที่เห็นสมควร

๑๒. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องขอดูรายละเอียด และตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของสถานที่ที่ต้องทำงานเองก่อนการยื่นประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น

๑. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๒. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๕

<u>ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้</u>

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้.-

P = (PO) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ธาราสุรกาญจน์ จำกัด
THASARUNGARDON CO.,LTD.

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุมอัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือ ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

<u>หมวดที่ ๒ งานดิน</u>

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดิน ให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อย หรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร K = ๐.๔๐ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Ft/Fo

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
ผู้รับมอบอำนาจ

ศิริรายรุ่งอรุณ ก่อสร้าง SASIRUNGAROON CO.,LTD.

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วไป ระยะทางขนย้าย ไป – กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ใช้สูตร K = ๐.๔๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

<u>หมวดที่ ๓ งานทาง</u>

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT, SLURRY SEAL

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๓๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึงผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่นงานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๒๕ St/So

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๐๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ St/So

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
ผู้รับมอบอำนาจ

ทิพรายรุ่งอรุณ จำกัด
TIPRAIRUNGARUN CO.,LTD.

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร K = ๐.๔๐ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๒๕ Ct/Co + ๐.๒๐ Mt/Mo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เสนอราคาประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทหารรุ่งอรุณ
THAHARUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเสนอราคาประกวดราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้าง งานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรุ่งอรุณ การก่อสร้าง SIRIRUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

.....

๑. <u>ภายในกำหนด ๒ ปี</u>

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับ**กรมทางหลวง**จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่**กรมทางหลวง**ได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. <u>ภายในกำหนด ๑ ปี</u>

๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ดาดคอนกรีต (Concrete)
๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
๒.๗ งานปลูกหญ้า
๒.๘ งานปลูกต้นไม้
๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว ยกเว้นสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. <u>ภายในกำหนด ๓ ปี</u>

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๗ ผนวก ๗

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร
ภาค ๒
เครื่องหมายจราจร
(MARKING)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๓

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

กรกฎาคม ๒๕๓๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๗ ผนวก ๗

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) Specification For Road Marking

กรมทางหลวง

กรกฎาคม ๒๕๕๑

กระทรวงคมนาคม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๙ ผนวก ๙

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(GENERAL SPECIFICATION)

กรมทางหลวง

มกราคม ๒๕๒๒

กระทรวงคมนาคม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปริญญ์ว สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ 2.10 ผนวก 10

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD. TAX ID : 0335565000324
24 ม.11 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทร.083-333-3375,080-152-7733 แฟกซ์.045-826-185
24 M.11, Dan, Rasisalai, Sisaket, Thailand 33160. E-mail : thasirungaroon_24@hotmail.com

ที่ ทร.๑๘๐/๒๕๖๖

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
เลขที่ ๔๔๓
วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๓๕ น.

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง หนังสือขอต่อรองราคาและปรับลดราคา ที่ คค ๐๖๐๕๓/พ.๑/๔๑๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ได้ยื่นเสนอราคาประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ราคาที่เสนอ ๒๙,๙๗๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ทางบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาลงอีกคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๙๗๕,๕๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด จึงขอเรียนชี้แจงว่าราคาดังกล่าว ทางบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดรูปแบบเงื่อนไขรายการสัญญาทุกประการและใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถดำเนินการไปได้จนแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการโดยไม่ละทิ้งงานเนื่องจาก

๑.มีเครื่องมือ – เครื่องจักร บุคลากรที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

๒.มีวัสดุหลักที่จำเป็นสำหรับก่อสร้างในปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพตามข้อกำหนด

๓.มีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 3 มี.ค. 2566 น.
๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒
-เพื่อโปรดทราบ

(นางเขมิกา ประมวลธนกร)
รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (บ)

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม. 10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1.	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สามบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30,260.00	3.95	119,527.00
2.	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3,800.00	58.95	224,010.00
3.	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	200.00	64.95	12,990.00
4.	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หกสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	600.00	64.95	38,970.00
5.	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสองบาทแปดสิบสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	6,330.00	202.80	1,283,724.00
6.	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3,070.00	275.80	846,706.00
7.	SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	2,840.00	356.75	1,013,170.00
8.	SOIL CEMENT BASE เป็นเงิน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3,420.00	779.45	2,665,719.00
9.	PRIME COAT เป็นเงิน สี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	15,000.00	48.95	734,250.00
10.	TACK COAT เป็นเงิน สิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	38,050.00	15.98	608,039.00
11.	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สามพันสองร้อยเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	TON	142.00	3,201.50	454,613.00
12.	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	15,000.00	383.74	5,756,100.00
13.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	38,050.00	383.74	14,601,307.00

คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับและตรวจสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 3 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASARIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีจัน)
กรรมการผู้จัดการ

ตัวอย่าง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม. 10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
14.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 เป็นเงิน หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	12.00	1,347.00	16,164.00
15.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 เป็นเงิน สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	56.00	2,147.00	120,232.00
16.	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 เป็นเงิน สามพันสิบเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	48.00	3,019.00	144,912.00
17.	RELOCATION OF EXISTING GUARDRAIL W-BEAM GUARD RAIL เป็นเงิน สองร้อยสามสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	M.	248.00	230.00	57,040.00
18.	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีไฟรม) เป็นเงิน สามพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	21.00	3,507.00	73,647.00
19.	R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M. เป็นเงิน ห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	75.00	540.25	40,518.75
20.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET เป็นเงิน หนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	50.00	10,827.25	541,362.50
21.	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	420.00	391.50	164,430.00
22.	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1,150.00	391.50	450,225.00
23.	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.00	7,843.75	7,843.75
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,975,500.00

ราคารวมทั้งสิ้นเขียนเป็นตัวหนังสือ

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แสนอราคา ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(นายปริญญา สาลีวัน)

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....

๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

กฉ๒๓๒

ต้นฉบับ



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คค ๐๖๐๕๓/พ.๑/e.๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อจังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.


ต้นฉบับ

ข้อ 2.11 ผนวก 11

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คู่มือเล่มที่ 1

1 คู่มือ มาตรฐานป้ายจราจร

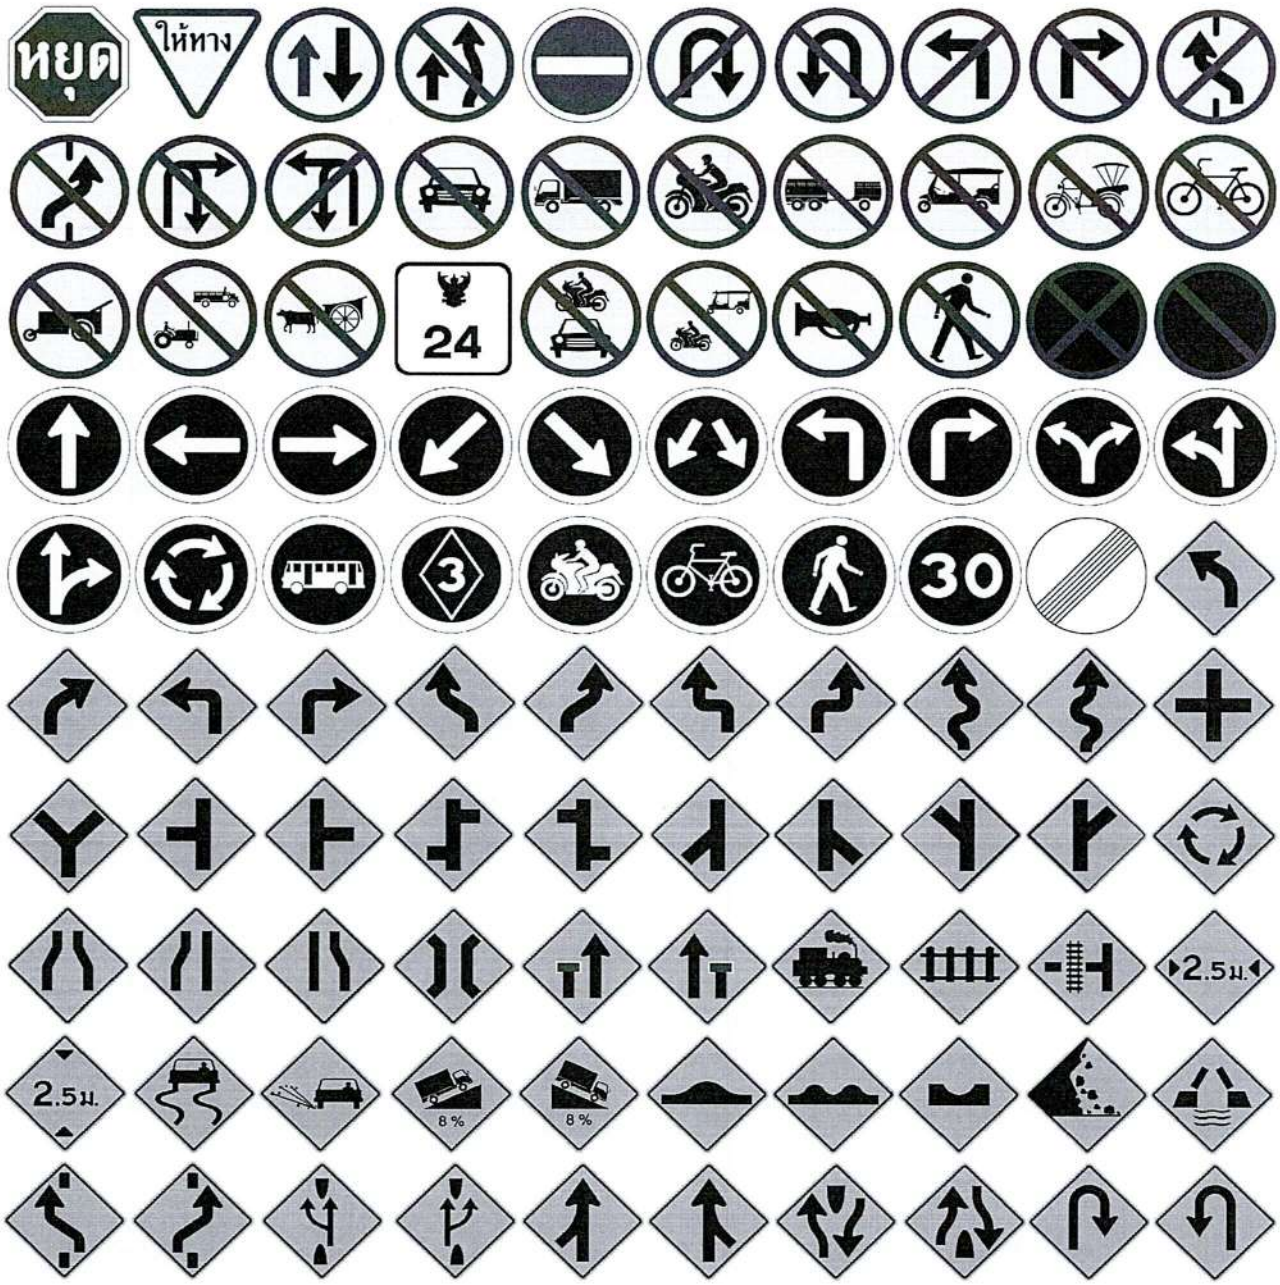

กรมทางหลวง

มีนาคม 2561

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGARUN CO.,LTD.


ต้นฉบับ

ข้อ 2.12 ผนวก 12

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

คู่มือเล่มที่ 3

3 คู่มือ เครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และ งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน

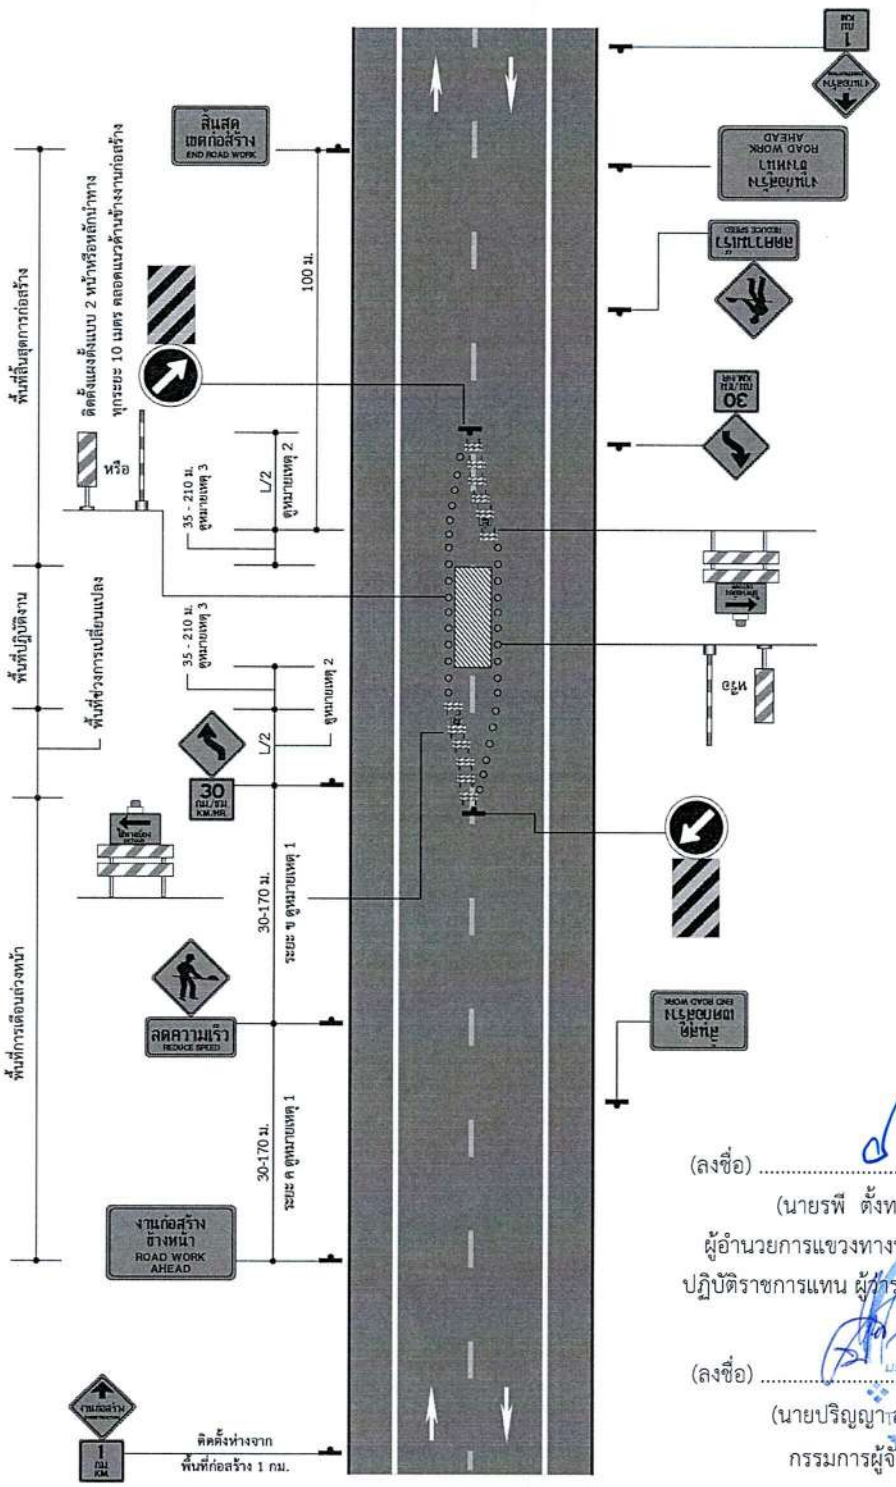

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สกสีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทองกรุงการโยธา จำกัด
THONGKRUNGKARNYOTHA CO.,LTD.



กรมทางหลวง

มีนาคม 2561

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ 2.14 ผนวก 14

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

แนวทางการพิจารณา
ขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

กรมทางหลวง

สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ถึง ที่ ๒๑๙๑ วันที่ - ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
ทล. เลขที่รับ ๖๑๙๘ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๑
เลขที่รับ ..... วันที่ .....

กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๓ ๑๔๕๒๔
วันที่ ๒ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๓๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๓๕๔-๖๘๐๒,๒๓๐๒๓
ที่ สท.๑/๕๐๙๓ **วันที่** ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

(๑) เรียน อทล.

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา และได้มีการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวงเสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมามาด้วยแล้ว

(นายกมล หมั่นทำ)
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา

สำนักก่อสร้างทางที่ ๑
กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๑๐๗๗๗
วันที่รับ ๒ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๒๕ น.

(๒) เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม (รทส.)
- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการต่อไป

(นายชานินทร์ สมบูรณ์)
อธิบดีกรมทางหลวง
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑

(๓) เรียน เลขานุการคณะกรรมการฯ (สท.1)
- เพื่อทราบตาม (๒)
- ดำเนินการต่อไป

(นายกมล หมั่นทำ)
รองอธิบดีกรมทางหลวง
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

ที่ สท.๑.๑/๕๒๒๒ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

(๔) เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง สำนักงานสำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง สำนักงานบำรุงทาง
เพื่อทราบตาม (๑) + (๒) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAI RUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

1. **<u>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102</u>**

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

(4) เหตุอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

2. **<u>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</u>**

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

3. **<u>คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/120/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560</u>**

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรัฐพรรณ จำกัด THASAIRUNGARDUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดี) ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และอธิบดีได้มอบอำนาจในการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในวงเงินอำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างของอธิบดี (ไม่เกิน 200 ล้านบาท) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. หน่วยงานส่วนกลาง มอบอำนาจให้รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลางตามสายการบังคับบัญชา
2. หน่วยงานภูมิภาค มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในงานจัดจ้าง
3. ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดทุกกรณี

4. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

ในการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาด้วยเหตุ (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (2) เหตุสุดวิสัย (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งเหตุดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจ้างตามสัญญา ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยจะต้องพิจารณาว่าคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้กับทางราชการเป็นไปอย่างปกติตลอดมา และต้องไม่มีพฤติการณ์ที่จะทิ้งงานของทางราชการ หากมีเหตุผลอันสมควรที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับตามสัญญา แม้ได้ดำเนินการล่วงเลยกำหนดระยะเวลาส่งมอบหรือแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ต้องยังมิได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

5. **หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/ ว11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543**

กรณีที่ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้รับจ้างแล้ว ต่อมาหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

6. <u>หนังสือตอบข้อหารือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305/10406 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2541</u>

- การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ล่วงเลยกำหนดเวลาของสัญญาหรือข้อตกลงไปแล้ว และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว

- การพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น

ในการขยายเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นสมควรว่าระยะเวลาที่เสียไปมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง และเห็นสมควรขยายระยะเวลา หรืองดหรือลดค่าปรับให้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีก โดยใช้เพียงคำสั่งอนุมัติของผู้มีอำนาจประกอบสัญญาไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินหรือคืนเงินค่าปรับให้แก่คู่สัญญาก็ได้

7. <u>หนังสือตอบข้อหารือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/2829 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545</u>

กรณีกรมฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทำงานให้แก่ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อมาเมื่อล่วงเลยเวลาทำการตามที่ระบุในสัญญาจ้างแล้วจึงสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้เฉพาะบางช่วง และภายหลังเมื่อกรมฯ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เสร็จแล้วจึงจะมอบพื้นที่ช่วงอื่น ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างอีก หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมทางหลวงติดปัญหาอุปสรรคในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเมื่อเหตุอุปสรรคดังกล่าวสิ้นสุดลงในแต่ละช่วง กรมฯ ก็ย่อมใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในแต่ละช่วงได้ โดยกรมฯ จะต้องพิจารณาด้วยว่าเหตุอุปสรรคดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับงานก่อสร้างในส่วนอื่นและเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาหรือไม่

สิทธิที่คู่สัญญาจะได้รับการพิจารณา

คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุแห่งการขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ 182 ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรัฐสุวรรณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

เอกสารประกอบการพิจารณาขอขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ

หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับอย่างน้อยดังนี้

1. สำเนาสัญญา
2. สำเนาหนังสือแจ้งขอเข้าทำงานและขอรับมอบพื้นที่ตามสัญญาของผู้รับจ้าง ซึ่งการกำหนดวันเข้าทำงาน ให้ระบุวันที่แน่นอน ห้ามใช้คำว่า "ดาดว่า" เพราะจะมีปัญหาในการพิจารณา (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือมอบพื้นที่ทำงานของผู้ว่าจ้างทุกครั้งที่ได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างหรือสำเนาหนังสือที่แจ้งโดยกำหนดวันที่แน่นอนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือผู้รับจ้าง แจ้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างได้ เพื่อขอขยายเวลานั้น แจ้งเหตุติดขัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือแจ้งฉบับแรก สำเนาหนังสือขอขยายอายุสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับของผู้รับจ้าง โดยต้องระบุสาเหตุและจำนวนวันที่ขอขยายอายุสัญญาด้วยจะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา กรณีที่ขอขยายอายุสัญญาล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ทราบวันที่มอบสถานที่ให้ได้เนื่องจากไม่ทราบจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
5. สำเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯเจ้าของพื้นที่แจ้งหน่วยงานเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคให้ทำการรื้อย้าย
6. สำเนาหนังสือหน่วยงานเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคแจ้งผลการดำเนินการ
7. สำเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯ เจ้าของพื้นที่ แจ้งยืนยันวันที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วเสร็จพร้อมให้ผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้างได้
8. สำเนาใบตรวจรับงาน (กรณีงานแล้วเสร็จให้แจ้งวันแล้วเสร็จด้วย)
9. บันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างทั้งชุด (หากกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นไว้โดยชัดเจน)
10. Work Schedule, Bar Chart ของ Main Item และบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับกรณีขอต่ออายุสัญญา (บางกรณี)
11. บันทึกของสำนัก ฯ หรือกองเจ้าของงาน สรุปข้อเท็จจริงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ รวมทั้งให้อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอ พร้อมความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถนำไปประกอบการพิจารณากรณีนั้นได้
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผนผัง รูปตัด ฯลฯ (ถ้ามี) เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับกรณีขอต่ออายุสัญญา (บางกรณี)
13. กรณีเกิดอุทกภัย หรือภัยพิบัติ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ประกาศจังหวัดฯ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

การคำนวณเวลาทำการสำหรับงานส่วนที่เหลือเฉพาะติดขัดงานก่อสร้าง

เวลาทำการสำหรับงานส่วนที่เหลือเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง มี 2 กรณี

❶ กรณีงานที่มีลักษณะเดียวกัน และไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน (ส่วนใหญ่จะเป็นงานอย่างเดียว)

- คำนวณปริมาณงานส่วนที่ติดขัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และเทียบกับระยะเวลาทำการตามสัญญาเดิม จะได้จำนวนวันที่ต้องใช้ในการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างสะพาน

❷ กรณีที่ต้องก่อสร้างงานหลายอย่าง และลักษณะการทำงานไม่เหมือนกัน

- คำนวณจำนวนวันที่ต้องใช้ทำการของงานแต่ละอย่างตามหลักเกณฑ์การคิดเวลาทำการของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักร จำนวนชุดตามชั้นผู้รับเหมา แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องแบ่งไปใช้งานส่วนที่ไม่ติดขัดด้วย

ตัวอย่าง สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างโครงการ A ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พบปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 (ภาคผนวก)

กรณีที่ 1 มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 แนวทางการพิจารณา

- ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติแล้วนั้น เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 จะเหลือเฉพาะงานเบ็ดเตล็ด
- คำนวณปริมาณงานส่วนที่ติดขัดและเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง การคำนวณเวลาทำการ ให้ใช้เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำปริมาณงานส่วนที่เหลือ + งานเบ็ดเตล็ดตามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือในแผนงานของส่วนที่ไม่ติดขัด + งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่ติดขัด

กรณีที่ 2 มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 แนวทางการพิจารณา

- ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติแล้วนั้น เมื่อถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จะเหลืองานรองพื้นทาง งานพื้นทาง ผิวทาง งานเบ็ดเตล็ด
- คำนวณปริมาณงานส่วนที่ติดขัดและเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง การคำนวณเวลาทำการให้ใช้เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำปริมาณงานส่วนที่เหลือ + งานเบ็ดเตล็ดตามเปอร์เซ็นต์เหลือในแผนงานของส่วนที่ไม่ติดขัด + ปริมาณงานส่วนที่ติดขัด + งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่ติดขัด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ถาวรรุ่งการุญ จำกัด THASANRUNGARUJON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

กรณีที่ 3 มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณา

- สิ้นสุดสัญญาเดิมแล้ว
- คำนวณปริมาณงานส่วนที่ติดขัดและเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง การคำนวณเวลาทำการให้ใช้เครื่องจักรจำนวน 4 ชุด โดยนำเฉพาะปริมาณงานส่วนที่ติดขัด + งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่ติดขัด

การคำนวณเวลาทำการให้แสดงในรูป Bar Chart ตามลำดับขั้นตอนของการก่อสร้างนั้น ๆ แต่ทั้งนี้อาจเผื่อเวลาตามลักษณะการก่อสร้างและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้.-

- เวลาเตรียมการขนย้ายเครื่องจักร
- ปริมาณงานเหลือน้อย แต่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานต้องใช้เทคนิคสูงและความประณีต ต้องรอ Concrete Set ตัว ฯลฯ
- จำนวนวันที่เสียไปเนื่องจากฝนตกและทำงานไม่ได้

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ


การพิจารณาจำนวนวันที่จะขยายอายุสัญญา (ให้ไว้เป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณา)

กำหนดให้ ก = ระยะเวลาที่รอคอยการส่งมอบพื้นที่

ข = ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง คำนวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ

ค = ระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิมนับตั้งแต่วันรับมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

1. กรณีผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา

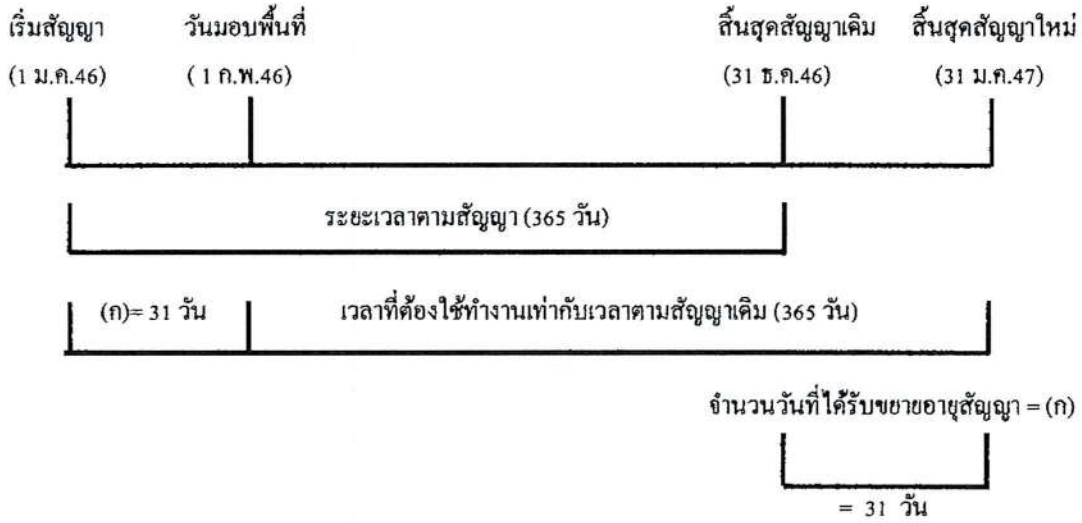

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่สูญเสียไปนับตั้งแต่วันเริ่มต้นอายุสัญญาถึงก่อนวันที่ได้รับมอบพื้นที่

= (ก)

ตัวอย่าง โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มต้นสัญญาผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้เลย จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 จึงมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่สูญเสียไปนับตั้งแต่วันเริ่มต้นอายุสัญญา (1 ม.ค.46) ถึงก่อนวันที่ได้รับมอบพื้นที่ (31 ม.ค.46)

= 31 วัน

นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 31 ม.ค.47

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD.


ต้นฉบับ

2. กรณีผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา แต่มีบางส่วนติดขัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือติดขัดสาธารณูปโภค หรือมีอุปสรรคอื่นใดที่เป็นเหตุติดขัดการก่อสร้าง มี 2 กรณี

2.1 แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จในอายุสัญญา

<u>กรณีที่ 1</u>

ถ้าระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง (ข) น้อยกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม นับแต่วันรับมอบพื้นที่ (ค) จะไม่ขยายอายุสัญญาให้

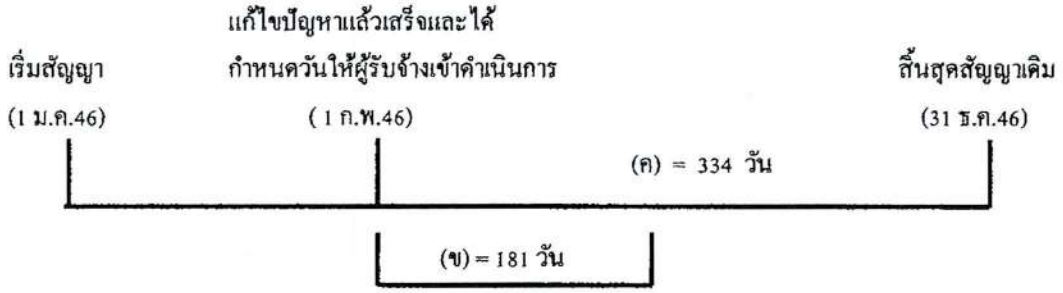

<u>ตัวอย่าง</u>

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มต้นสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 ผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่จุดที่ติดขัดการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้ว่าจ้างได้คำนวณระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ข) เป็นเวลา 181 วัน

กรณีนี้ ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง (181 วัน) น้อยกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม (334 วัน) จะไม่ขยายอายุสัญญาให้

<u>กรณีที่ 2</u>


ถ้าระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง (ข) มากกว่าเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาเดิม (ค)

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (ข) – (ค)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

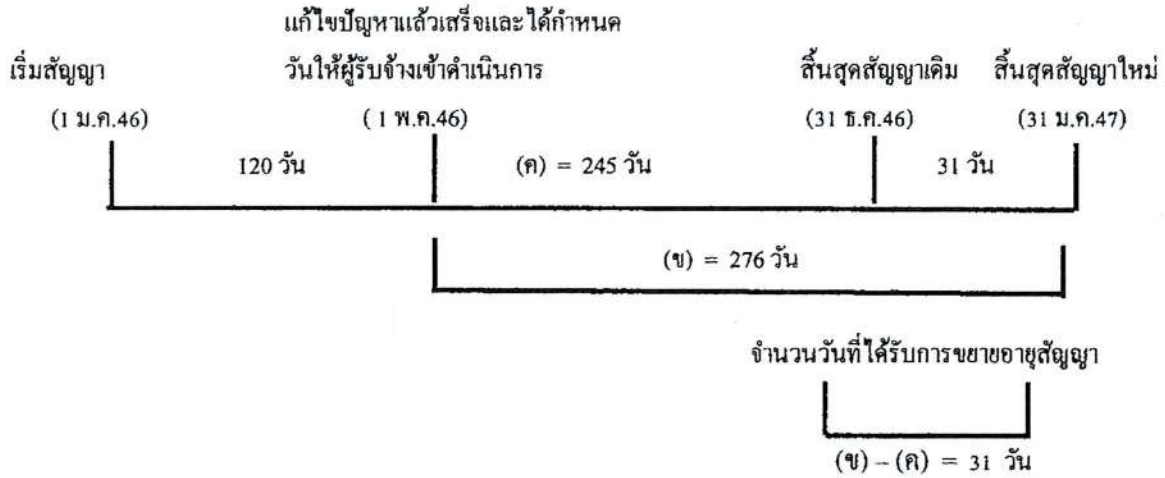

ตัวอย่าง

โครงการฯ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่จุดที่ติดขัดการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้ว่าจ้างได้คำนวณระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ข) เป็นเวลา 276 วัน

จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา = (ข) - (ค)

= 276 – 245

= 31 วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิม

โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 31 มีนาคม 2547

2.2 แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหลังจากสิ้นสุดสัญญา

กรณีที่ 1


ณ วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ยังมีงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างเหลืออยู่

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สงลี่วัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรถรุ่งอรุณ จำกัด THASARUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

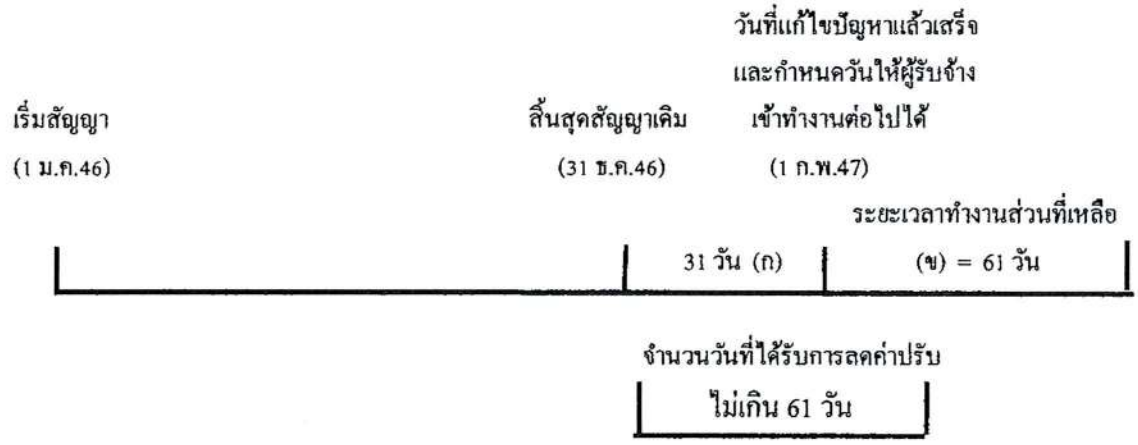

จำนวนวันที่ได้รับการลดค่าปรับไม่เกิน = (ข)

<u>ตัวอย่าง</u>

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) ผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งขณะนั้นงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะส่วนที่ติดขัดปัญหาคำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงใช้เวลา 61 วัน (ข)

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้าง คำนวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ข) ส่วนระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (1 มกราคม 2547) ถึงวันก่อนวันมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (31 มกราคม 2547) จำนวน 31 วัน (ก) จะไม่ได้รับการลดค่าปรับเนื่องจากงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวนวันที่ได้รับการลดค่าปรับ ไม่เกิน = 61 วัน


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

กรณีที่ 2

ณ วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ผู้รับจ้างทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียเวลารอคอย

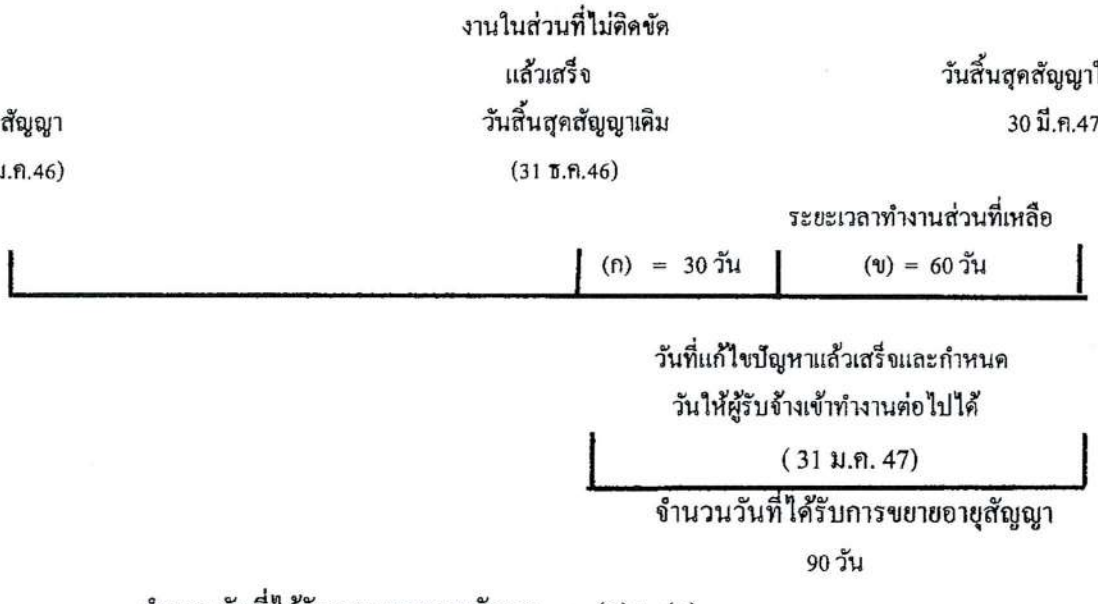

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (ก) + (ข)

ตัวอย่าง

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) ผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ แต่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (31ธันวาคม 2546) จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะส่วนที่ติดขัดปัญหา คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงใช้เวลา 60 วัน (ข)

- ระยะเวลารอคอยการส่งมอบพื้นที่ (ก) ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จ (1 มกราคม 2547) ถึงวันก่อนวันมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (31 มกราคม 2547) จำนวน 30 วัน
- ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้างคำนวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ข) จำนวน 60 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (ก) + (ข)

= 30 + 60

= 90 วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 30 มีนาคม 2547

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาสรุงอรุณ จำกัด
TASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

กรณีที่ 3

ณ วันสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่วันที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและกำหนดวันให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ผู้รับจ้างทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างแล้วเสร็จทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียเวลารอคอย

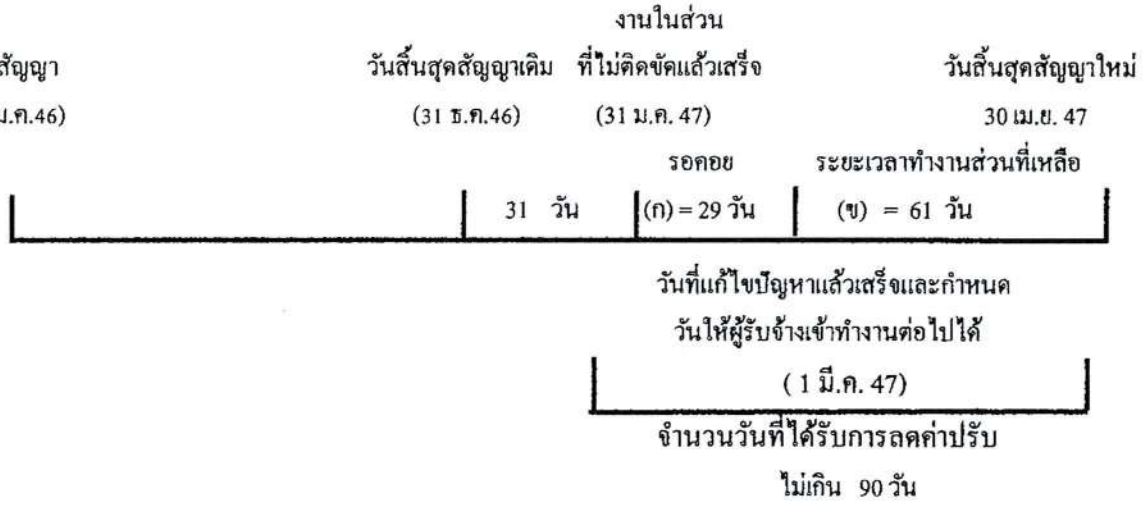

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = (ก) + (ข)

ตัวอย่าง

โครงการ A เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน เมื่อเริ่มสัญญาผู้ว่าจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ยังมีจุดติดขัดการก่อสร้างอยู่ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิม (31 ธันวาคม 2546) ผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จนถึงวันที่ 31มกราคม 2547 งานก่อสร้างในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จ แต่ผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2547 จึงสามารถส่งมอบพื้นที่จุดติดขัดการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะส่วนที่ติดขัดปัญหาคำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงใช้เวลา 61 วัน (ข)

- ระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม (1 มกราคม 2547) ถึงวันที่งานในส่วนไม่ติดขัดแล้วเสร็จ (31 มกราคม 2547) จำนวน 31 วัน ไม่ได้รับการลดค่าปรับ เนื่องจากงานในส่วนที่ไม่ติดขัดการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
- ระยะเวลารอคอยการส่งมอบพื้นที่ (ก) ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำงานในส่วนที่ไม่ติดขัดแล้วเสร็จ (1 กุมภาพันธ์ 2547) ถึงวันก่อนวันมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ (29 กุมภาพันธ์ 2547) จำนวน 29 วัน
- ระยะเวลาที่ใช้ทำงานเฉพาะที่ติดขัดการก่อสร้างคำนวณตามหลักเกณฑ์กรมฯ (ข) จำนวน 61 วัน

จำนวนวันที่ได้รับการลดค่าปรับ ไม่เกิน = (ก) + (ข)

= 29 + 61 (90 วัน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรัพย์สุวรรณ จำกัด THASAIRUNG SUWAN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

2.3 กรณีเกิดอุทกภัย

พิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง โดยพิจารณาเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริง ดังนี้


1. พื้นที่โครงการก่อสร้างตามสัญญาได้รับผลกระทบและไม่สามารถทำการก่อสร้างได้จริง

2. มีประกาศของจังหวัดแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย หรือเป็นเขตประสบภัยพิบัติอุทกภัย โดยพิจารณาจากวันเริ่มต้นประกาศฯ ถึงวันสิ้นสุดประกาศฯ หรือวันที่โครงการฯ มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อไปได้ในกรณีไม่มีประกาศของจังหวัดกำหนดวันสิ้นสุดไว้ ทั้งนี้โครงการฯ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

3. น้ำท่วมคันทาง โดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้โครงการฯ รับรองด้วย

4. หากมีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมภายหลังน้ำลด ให้คำนวณปริมาณงานที่ต้องดำเนินการฟื้นฟู แสดงในรูปของ Bar Chart

5. เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

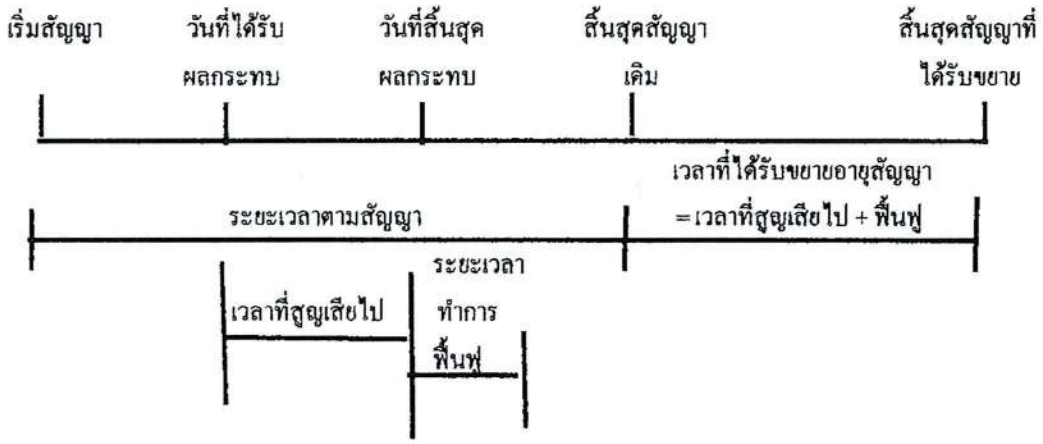

จำนวนวันที่ได้รับการขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มได้รับผลกระทบ ถึงวันที่สิ้นสุดผลกระทบ และหรือวันที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ + จำนวนวันที่ใช้ฟื้นฟูภายหลังน้ำลด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรุ่งกรรณ จำกัด THASAIRUNGARDON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

2.5 กรณีหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ ตามหนังสือกรมฯ ขอความร่วมมือหรือสั่งให้หยุดการก่อสร้าง

พิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างตามวันที่หยุดงานจริง โดยไม่ตัดวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามหนังสือกรมฯ ขอความร่วมมือหรือสั่งให้หยุดการก่อสร้างประกอบกับบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และให้ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา

2.6 กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นอันเป็นเหตุสุดวิสัย เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาได้ และปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงใด ๆ แตกต่างไปจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาขยายเวลาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ลำดับขั้นตอนการเสนอขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ

นายช่างโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค
เสนอ ผู้จัดการโครงการ

↓

ผู้จัดการโครงการ พิจารณาเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

↓

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณา

↓

สำนักฯ/กองเจ้าของงาน พิจารณาและนำเสนอ
กรมฯ ขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ

↓

ฉนก. เสนอ คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ
งานจ้างเหมา พิจารณา

↓

คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับงานจ้างเหมา
นำเข้าที่ประชุมพิจารณา ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ

↓

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

↓

สำนัก/กองเจ้าของงาน นัดผู้รับจ้างลงนาม
บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรัตน์สรรณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาทำการงานก่อสร้างทางและสะพาน

1. งานที่ต้องใช้เครื่องจักรประเภทเดียวกัน เช่น งานก่อสร้างชั้นดินถม, วัสดุคัดเลือก , รองพื้นทางลูกรัง. พื้นทางหินคลุก ให้คำนวณเวลาทำการของงานแต่ละรายการแล้วนำมารวมกัน โดยคำนวณจากจำนวนเครื่องจักรงานก่อสร้างทางของผู้รับเหมาแต่ละชั้น ดังนี้.-

1.1 ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ชุด

1.2 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 4 ชุด

1.3 ผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้น 2 จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 3 ชุด

1.4 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 3 จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 2 ชุด

1.5 ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 4 จำนวนเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1 ชุด

กรณีผิวทางเป็นคอนกรีตให้พิจารณาระยะเวลาทำการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตตามความเหมาะสม เนื่องจากต้องมีระยะเวลาการบ่มคอนกรีต

2. งานที่มีปริมาณงานดินตัดมาก เช่น งานตัดเขา ระยะเวลาทำการของงานดินตัดมากกว่างานดินถม ให้ใช้เวลาทำการของงานดินตัดเป็นฐานในการกำหนดเวลาทำการ

3. ก่อนเริ่มงานดินถมคันทาง งานดินตัด หรืองานก่อสร้างสะพาน แล้วแต่กรณี ให้มีเวลาเตรียมการก่อนเริ่มสำหรับงานถางป่า ขุดตอ และเตรียมวัสดุก่อสร้างเป็นเวลา 7 วัน

4. งาน Prime Coat ให้เสร็จหลังงาน Base 7 วัน, งานชั้น Binder Course เสร็จหลังงาน Prime Coat 7 วัน

5. งานปรับปรุงทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และจำเป็นต้องก่อสร้างครั้งละด้าน และรอเบี่ยงการจราจรก่อนก่อสร้างอีกด้านหนึ่ง ให้เพิ่มเวลาทำการได้ไม่เกิน 30 วัน

6. งานที่มีการก่อสร้างสะพานรวมอยู่ในงานทางให้คำนวณ ดังนี้

6.1 คิดระยะเวลาทำการก่อสร้างสะพานเฉลี่ย 2 วัน/เมตร/ทีมงาน

6.2 จำนวนทีมงานก่อสร้างสะพานสามารถเพิ่มได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.3 งานทางที่มีมาตรฐานไม่เกินชั้น 1 จำนวนวันทำการก่อสร้างสะพานต้องไม่น้อยกว่า 150 วัน

6.4 งานทางที่มีมาตรฐานชั้นพิเศษ จำนวนวันทำการก่อสร้างสะพานต้องไม่น้อยกว่า 270 วัน

6.5 กรณีเวลาทำการงานทางมากกว่างานสะพานอยู่แล้ว ไม่ต้องเผื่อเวลาให้งานสะพานอีก

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

7. งานเบ็ดเตล็ดให้พิจารณาระยะเวลาตามวงเงินค่างาน ดังนี้.-

7.1 วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	ให้เวลาทำการไม่เกิน 60 วัน
7.2 วงเงินเกิน 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ให้เวลาทำการไม่เกิน 80 วัน
7.3 วงเงินเกิน 20 ล้านบาท	ให้เวลาทำการไม่เกิน 100 วัน

8. ระยะเวลาเผื่อไว้สำหรับฤดูฝนให้คำนวณ ดังนี้.-

8.1 ในพื้นที่ฝนตกปกติไม่เกิน 60 วัน/ปี

8.2 ในพื้นที่ฝนตกชุกไม่เกิน 90 วัน/ปี

8.3 ในพื้นที่ฝนตกชุกมาก (เฉพาะ จ.ตราด, จ.พังงา, จ.ระนอง, จ.จันทบุรี) คิดเวลาให้ไม่เกิน 120 น/ปี

9. กรณีมีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องรอเวลาการรุดตัว ให้เพิ่มระยะเวลาทำการตามเงื่อนไขพิเศษนั้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิพรุ่งเรืองกิจ จำกัด TIPRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

อัตราการทำงานของชุดเครื่องจักรก่อสร้างทาง 1 ชุด

ลำดับ	ลักษณะงาน	ผลงานต่อวัน	หน่วย
1	งานถางป่าขุดตอ		
	ขนาดเบา	11,000.00	ตร.ม.
	ขนาดกลาง	11,000.00	ตร.ม.
	ขนาดหนัก	7,000.00	ตร.ม.
2	งานตัดคันทาง		
	ดิน	600.00	ลบ.ม. ธรรมชาติ
	หินผุ	1,100.00	ลบ.ม. ธรรมชาติ
	หินแข็ง	300.00	ลบ.ม. ธรรมชาติ
3	งานดินถมคันทาง	600.00	ลบ.ม. แน่น
4	งานวัสดุคัดเลือก รองพื้นทาง ลูกรัง	500.00	ลบ.ม. แน่น
5	งานพื้นทาง หินคลุก	290.00	ลบ.ม. แน่น
6	งานไหล่ทาง ลูกรัง หินคลุก	310.00	ลบ.ม. แน่น
7	งานราดยางไพรม์โค้ต	5,000.00	ตร.ม.
8	งานราดยางแทคโค้ต	3,500.00	ตร.ม.
9	งานผิวทางแบบบาง		
	ชั้นเดียว	4,945.00	ตร.ม.
	สองชั้น	2,730.00	ตร.ม.
10	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต		
	เครื่องผสมแอสฟัลท์ติก	430.00	ตัน
	ปูผิวแอสฟัลท์ติกหนา 5 ซม.	3,500.00	ตร.ม.
11	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	เครื่องผสมคอนกรีต	175.00	ลบ.ม.
	ปูผิวคอนกรีตหนา 25 ซม.	875.00	ตร.ม.
12	งานพื้นทางวัสดุผสม Stabilized base	300.00	ลบ.ม. แน่น

หมายเหตุ 1. อัตราการทำงานนี้ใช้สำหรับคำนวณจำนวนวันทำการตามสัญญา สำหรับงานคันทางและโครงสร้างผิวทาง จำนวนวันทำงานสำหรับงานเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ จะนำมารวมภายหลัง

2. หน่วย ลบ.ม. ธรรมชาติ เป็นหน่วย ลบ.ม. แน่น ในสภาพธรรมชาติ (Bank volume)

3. หน่วย ลบ.ม. แน่น เป็นหน่วย ลบ.ม.แน่น ภายหลังการบดทับ (Compacted volume)

4. จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันคิด 7.00 ชม./วัน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีจันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรถรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๑๕ ผนวก ๑๕

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การจ้างช่วง

ภายหลังจากได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้ว ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒... (**สิบสอง**) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๑๖ ผนวก ๑๖

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจรคอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<๕๐ ม. และสะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๕ อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ 2.17 ผนวก 17

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
จ 3-50(1)-1/51 สร

ใบแทน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ ท. 6 / 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

อนุญาตให้ บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 37 ตรอก/ซอย - ถนน -

หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง แกใหญ่ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุรินทร์

ชื่อโรงงาน บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 50(1)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กำลังเครื่องจักร -371.00- แรงม้า จำนวนคนงาน -5- คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย ถนน นาบัว-เขาสวาย

หมู่ที่ 16 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง นาบัว

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุรินทร์

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีรายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 1 มี.ค. 2566
๑. ประธาน ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

(1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
(2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
(3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
(4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
(7) การอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
(8) บันทึกการตรวจสภาพธรรมเนียมรายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
(9) ลำดับและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ทวี บุญอำนวย
ลงชื่อ (นายทวี บุญอำนวย) ผู้อนุญาต
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
(ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลิวัน)
กรรมการผู้จัดการ
ทาสายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ใบแทน

จ 3-50(1)-1/51 สร

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

"ต้องมีและใช้ระบบขจัดเขม่าควันและฝุ่นละอองที่มีขนาดประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อขจัดเขม่าควันและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง"

ลงชื่อ สุรศักดิ์ ลำพา เจ้าหน้าที่

((นายสุรศักดิ์ ลำพา))

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณาและตรวจประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
รับที่ - 1 มี.ค. 2566 เวลา น.

ประธาน ๒. ๓.
๔. ๕. ๖. ๗.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนช่างก่อสร้าง ย.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ใบแทน

จ 3-50(1) 1/51 สร
ลำดับที่ 3

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถิตย์ จันทะลุน

ลงชื่อ นายสถิตย์ จันทะลุน เจ้าหน้าที่

(วิศวกรปฏิบัติการ)

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	แรงม้า/คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1	1 ม.ค. 64	371 / 5	9,000	หมด	15ครว 9 ธค 59	000886	(นายปิยะ ยินขุนทด) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม	(นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์) อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535							(นายธรรมชัย สุมาลี) วิศวกรปฏิบัติการ	—
							คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตฯ ผ่านระบบการอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ - 1 มี.ค. 2566 เวลา ... น. ๑. ... ประธาน ๒. ... ๓. ... ๔. ... ๕. ... ๖. ... ๗. ...	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

จ 3-50(1)-1/51 สร

ลำดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../..... **กระทรวงอุตสาหกรรม**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ **ผู้อนุญาต**

( )

ครั้งที่.....

ที่...../..... **กระทรวงอุตสาหกรรม**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ **ผู้อนุญาต**

( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

จ 3-50(1)-1/51 สร

ใบแทน

ลำดับที่ 5

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ **เจ้าหน้าที่**

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 1 มี.ค. 2566 น.
๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ **เจ้าหน้าที่**

( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีรัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ใบแทน

จ 3-50(1)-1/51 สร

ลำดับที่ 6

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

ครั้งที่	แจ้งประกอบกิจการ	เริ่มประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 1 มี.ค. 2566
๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARDON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARDON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

จ 3-50(1)-1/51 สร

ใบแทน

ลำดับที่ 7

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากผู้ประกอบกิจการโรงงานเดิม ชื่อ บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด ให้ผู้รับโอนฯ ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง ตามคำรับโอนใบอนุญาตฯ ลงรับเลขที่ 2063 ลงรับวันที่ 16 ตุลาคม 2556	อภิรักษ์ อ่ำสุริยะ (นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
2	ได้ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ ป.4/2551 ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-50(1)-1/51 สร วันที่ได้รับใบอนุญาต 29 มกราคม 2551 ผู้อนุญาตเดิม นายทวี บุญอำนวย อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต ตามคำขอทั่วไปเลขที่รับ 2099 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558	(นายปิยะ ยินขุนทด) หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 1 มี.ค. 2566 น.
ประธาน ๒. ๓.
๔. ๕. ๖. ๗.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ
ใบแทน

3 - 50(1) - 1/51 สร
ลำดับที่ 8

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่ 1

ที่ อ 3 / 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ 389 ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ 1 ตำบล / แขวง บ้านชบ อำเภอ / เขต สังขะ จังหวัด สุรินทร์

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 50(1)

ประกอบกิจการ ผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีต

กำลังเครื่องจักร 371 แรงม้า จำนวนคนงาน 1 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 178 ตรอก / ซอย - ถนน นาบัว-เขาสวาย

หมู่ที่ 16 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง นาบัว

อำเภอ / เขต เมือง จังหวัด สุรินทร์ ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ บรรจง สุกรีฑา ผู้อนุญาต

((นายบรรจง สุกรีฑา))

อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ใบแทน

จ 3-50(1)- 1/51 สร

ลำดับที่ 9

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	11 ม.ค.54	1 ต.ค. 53	371.00/5	ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 21 ก.ย.2553 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย.2554)				นางสุรีย์ลักษณ์ สูทรงดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2	11 ม.ค.55	10 ม.ค.55	371.00/5	2,700	-	007939	000020	นางสุรีย์ลักษณ์ สูทรงดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3	11 ม.ค.56	11 ม.ค.56	371.00/5	ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 30 ก.ย.2555 (1 ต.ค. 2555-30 ก.ย.2556)				นางสุรีย์ลักษณ์ สูทรงดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4	11 ม.ค.57	6 มิ.ย.57	371.00/5	2,700	657	011540	000015	นางจุฑาทิตย์ มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5	11 ม.ค.58	16 ต.ค.57	371.00/5	ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 16 ต.ค.2557 (1 ต.ค. 2557-30 ก.ย.2560)				นางจุฑาทิตย์ มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
6	11 ม.ค.59	16 ต.ค.57	371.00/5	ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 30 ก.ย.2555 (1 ต.ค. 2557-30 ก.ย.2560)				นางจุฑาทิตย์ มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
7	11 ม.ค.60	16 ต.ค.57	371.00/5	ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 16 ต.ค.2557 (1 ต.ค. 2557-30 ก.ย.2560)				นางจุฑาทิตย์ มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
8	11 ม.ค.61	๘ ก.พ.๖๑	371/5	๒๗๐๐	131	18871	๐๐๐๑๔	(นางจุฑาทิตย์ มณีดำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญง
๙	๑๑ ม.ค.๖๒	๒๗ ม.ค.๖๒	371/5	๒๗๐๐	207	๒๓๘๔	๐๐๐๑๘	(นางจุฑาทิตย์ มณีดำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
๑๐	๑๑ ม.ค.๖๓	๒๘ ม.ค.๖๓	371/5	๒๗๐๐	198 194	๒๓๐๘๔	๐๐๐๑๙	(นางจุฑาทิตย์ มณีดำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญง
๑๑	๑๑ ม.ค.๖๔	๑๑ ม.ค.๖๔	371/5	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓				เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
๑๒	๑๑ ม.ค.๖๕	๑๑ ม.ค.๖๕	371/5	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓				(นางจุฑาทิตย์ มณีดำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญง
๑๓	๑๑ ม.ค.๖๖	๑๑ ม.ค.๖๖	371/5	ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓				(นางจุฑาทิตย์ มณีดำ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
14	11 ม.ค.67	คณะกรรมการพิจารณาและออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ - 1 มี.ค. 2566						

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ / ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	สุรศักดิ์ ลำเภา (นายสุรศักดิ์ ลำเภา) หัวหน้าฝ่ายโครงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 1 ม.ค. 2566
๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองปฐพีก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสิวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ทะเบียนนิติบุคคลเลยที่ 0323524000166
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์ ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 99,900,000.00 บาท
   2. นายนิธิกร ดีเสมอ ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 100,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 389 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์/
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คณะกรรมการผู้จัดการมอบอำนาจให้ออกใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่ - 1 มี.ค. 2566 เวลา ... น.
ลงชื่อ ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

(นางสาวไอย์สุดารัชต์ หอมสมบัติ)
นายทะเบียน

บริษัท ทาทรายธุรอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง สังขะ จ.สุรินทร์

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาสิวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายธุรอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922002368

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ - 1 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368 ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องดนตรี เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

- 1 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368 ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- 1 มี.ค. 2566

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368 ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 51 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบธุรกิจการทำนา ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการอื่นๆ

(24) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวรถถังรถยนต์ โรงงานผลิตเชรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษโรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็กโรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูบานหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

(26) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(27) ประกอบธุรกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(28) ประกอบธุรกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(29) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

(30) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ขนแร่

(31) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(32) ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนต์

(34) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(35) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปทุกชนิด และส่วนโครงสร้างสำเร็จทุกชนิด

(36) ประกอบกิจกการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ดัดเข็บและปักรีดเสื้อผ้า

(37) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(38) ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ

(39) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

(40) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(41) ประกอบกิจการบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการพิเศษ
วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา น.
๑. ประธาน ๒. ๓.
๔. ๕. ๖. ๗.

บริษัท ทาสารยรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ สู่ยุคดิจิทัล Leading Business Digital Era Transformation

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:49 น. Ref:66100922002368 5/6

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาสารยรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ที่ 100922002368 ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 51 ข้อ ดังนี้

(42) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจำหน่าย

(43) ประกอบกิจการเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(44) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

(45) ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และการจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(46) ทำการซื้อ ขายและวัสดุดกแต่งทุกชนิด รวมทั้งซื้อ ขายให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

(47) การเข้าค้ำประกันบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ในการกู้ยืมเงิน การเบิกเงินเกินบัญชี การขอเครดิตตัวนวิธีอื่น รวมทั้งการรับ ออก โอน หรือสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจะมีหลักประกันซึ่งกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(48) ประกอบกจการผลิตยางแอสฟัลทริกคอนกรีตผสมสำเร็จรูป

(49) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมบำรุงรักษา บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

(50) ประกอบกิจการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

(51 ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อยื่นซองประกวดราคาหรือค้ำประกันตามสัญญาต่อบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - 1 มี.ค. 2566 น.
๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....
๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง

ต้นฉบับ

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 3210-028881-4 สำนักทะเบียน อำเภอสังขะ

รายการที่อยู่ 389 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
นางฉวีวรรณ พรหมบุตร

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 30 พ.ค. 2543

1

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3210-028881-4 ลำดับที่ 4

ชื่อ นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-3210-00168-63-0 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 20 พ.ค. 2490

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ จึง สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ยะ สัญชาติ ไทย

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 12 ม.ค. 2536 นางฉวีวรรณ พรหมบุตร

•• ไปที่ คณะกรรมการ... นายทะเบียน
วันที่ - 1 มี.ค. 2566 เวลา ... น.
๑. ... ประธาน ๒. ... ๓. ...
๔. ... ๕. ... ๖. ...

5

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 3210 00168 63 0
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชูชาติ มหรรทัศนพงศ์
Name Mr. Chuchat
Last name Mahanthatsanaphong
เกิดวันที่ 20 พ.ค. 2490
Date of Birth 20 May 1947
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 389 หมู่ที่ 1 ต.บ้านชบ
อ.สังขะ จ.สุรินทร์
31 ต.ค. 2559 วันออกบัตร
31 Oct. 2016 Date of Issue
(ชาญชัย บุญชะโสภัส) เจ้าพนักงานออกบัตร
ตลอดชีพ วันบัตรหมดอายุ LIFELONG Date of Expiry
3210-02-1021151

BORA-3.2-02-2559

ประเทศไทย THAILAND

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สกลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ 2.18 ผนวก 18

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

แบบหนังสือแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จำนวน ๑ ชุด

โดยหนังสือฉบับนี้ หจก.รัตนชาติก่อสร้าง โดย นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ขอแจ้งยืนยันให้ความยินยอมให้ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และยืนยันจะให้การสนับสนุนจัดส่งยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ใช้ดำเนินการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ตามรูปและรายละเอียดของกรมทางหลวง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ มหรรทัศนพงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา ..... น.

๑. ..... ประธาน ๒. ..... ๓. .....

๔. ..... ๕. ..... ๖. ..... ๗. .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.


ต้นฉบับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

แผนที่แสดงที่ตั้งระยะขนส่งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงสถานที่ก่อสร้าง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร

แผนที่แสดงเส้นทางขนส่ง

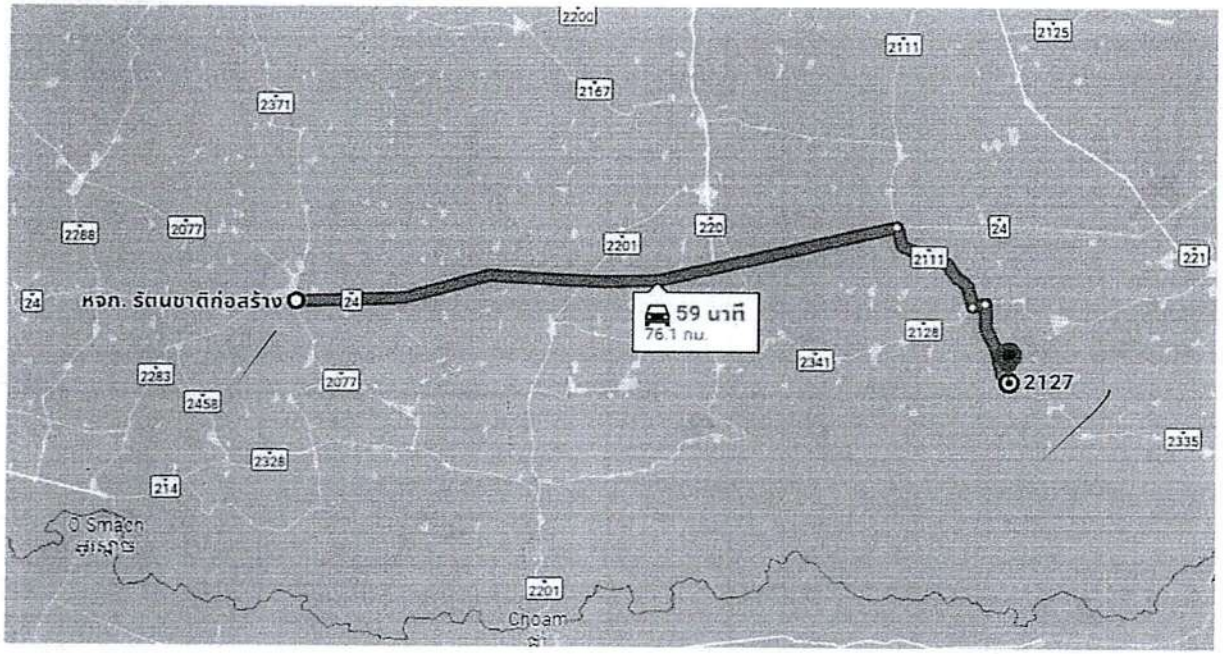

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ		ระยะทางขนส่ง (กม.)
1	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant	ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	
		พิกัด Lat = 14.621015 Long = 103.853633	
2	ตำแหน่งกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง	ทล.2127 กม.8+100	
		พิกัด Lat = 14.553242 Long = 104.454301	
3	เส้นทางขนส่ง		
	ทล.24 กม.250+700 (0+350 กม.)		0.350
	ทล.24 กม.250+700 - ทล.24 กม.295+900		45.200
	ทล.2111 กม.27+900 - ทล.2111 กม.39+000		11.100
	ทล.2127 กม.0+000 - ทล.2127 กม.8+100 (จุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง)		8.100
ระยะทางขนส่งจาก Plant ถึง กึ่งกลางโครงการก่อสร้าง		รวม	64.400

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 1/ มี.ค. 2566 เวลา น
๑. ประธาน ๒. ๓.
๔. ๕. ๖. ๗.

หมายเหตุ เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง อ.สังขะ สุรินทร์

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ 2.20 ผนวก 20

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

(แบบที่ 1)

ประกาศ	
ตรวจตรา หน่วยงาน (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงาน..... ..... ที่อยู่..... โครงการ ก่อสร้าง..... ลักษณะงานก่อสร้าง .... ผู้รับจ้าง บริษัท..... ที่อยู่ ..... โทร.....โทรสาร..... สัญญาเลขที่ .....เริ่มต้น.....สิ้นสุด.....ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ..... ผู้ควบคุมงาน 1. .....โทร..... 2. .....โทร..... 3. .....โทร..... 4. .....โทร..... สำนักงานสนาม โทร. ..... โทรสาร. ..... เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง 1. ..... โทร. ..... 2. ..... โทร. .....
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่นป้ายขนาด 2.40 x 3.60 เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน (ป้ายงานของ กทม. ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธราธรุ่งอรุณ จำกัด
THASARUNGARUN CO.,LTD.

ต้นฉบับ

แบบ กค. 15

หวงครา หน่วยงาน (ถ้ามี)	ประกาศ ชื่อหน่วยงาน..... ..... ที่อยู่.....
งานก่อสร้าง..... ลักษณะงานก่อสร้าง .... ผู้รับจ้าง บริษัท..... ที่อยู่ ..... โทร..... สัญญาเลขที่.....เริ่มต้น.....สิ้นสุด..... ระยะเวลาก่อสร้าง .....วัน วงเงินค่าก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมงาน 1. .....โทร..... 2. .....โทร..... 3. .....โทร..... สำนักงานตั้งอยู่/เบอร์โทรติดต่อ โทร. ..... โทรสาร. ..... เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง 1.. ..... โทร. ..... 2. ..... โทร.	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ขนาดอักษรโดยประมาณควรเห็นได้ชัดเจน (ป้ายงานของ กทม. ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว)


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทศรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

(แบบที่ ๒)

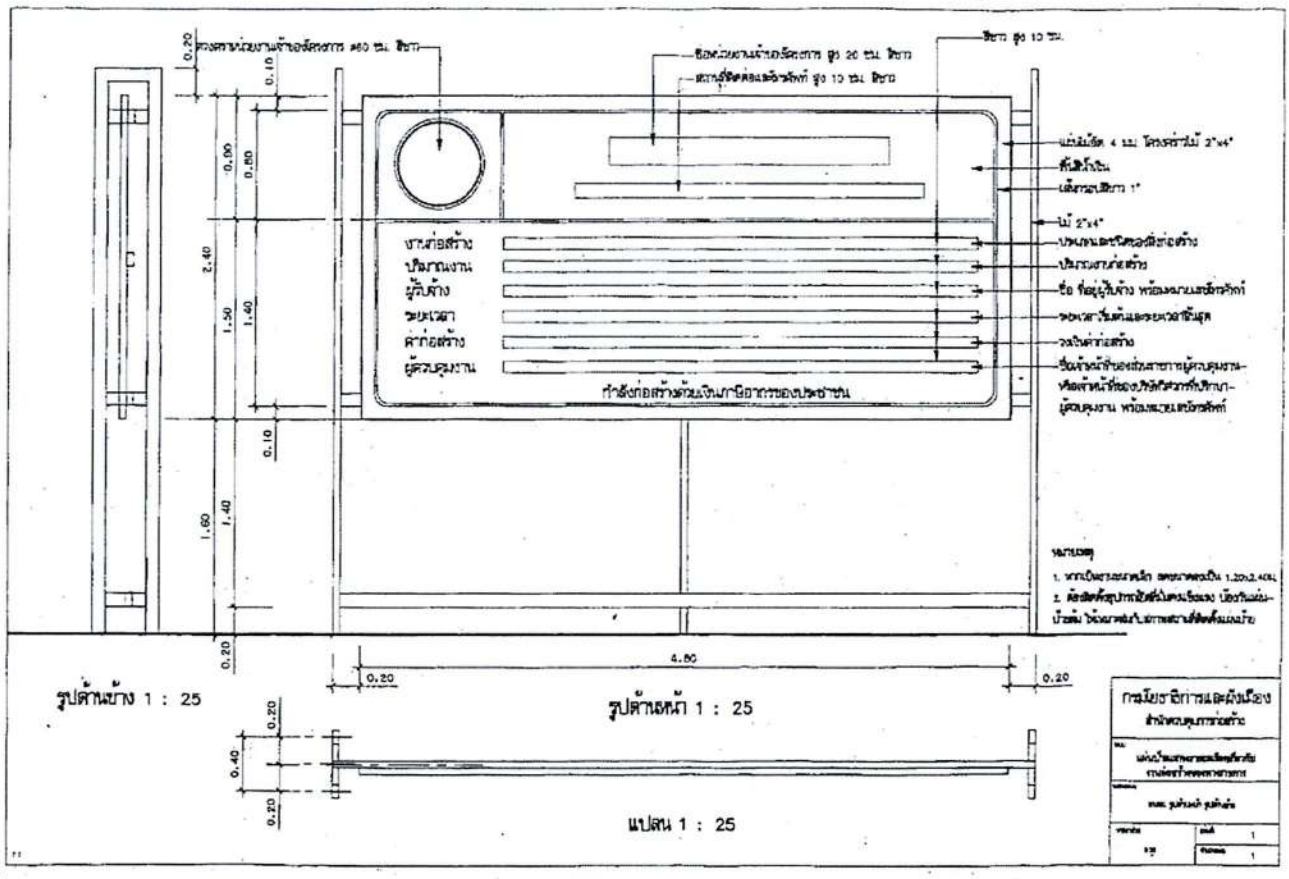

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปริญญา สาลีวัน)

กรรมการผู้จัดการ

ศิริรุ่งอรุณ SIRIRUNGAROON CO.,LTD.

ต้นฉบับ

ข้อ ๒.๒๑ ผนวก ๒๑

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ศก.๒/๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เงื่อนไขแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุใน ประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					XXX	XXX	XXX
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

(ลงชื่อ) ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ : หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้ ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ไทยรุ่งอรุณ THAIRUNGAROON CO.,LTD

ต้นฉบับ

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็กใน ประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

(ลงชื่อ) ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ : หากปริมาณของเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้ ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/ ๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
งานบำรุงทาง
ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙

****

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวง ไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

๒. กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของงานกำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญา โดยมิได้เป็นความผิดของหน่วยงานเจ้าของงาน

๓. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง

๔. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงาน ภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมฯ อนุมัติ เลขที่ สมท. ๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา

๕. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ที่ได้รับแจ้ง

๖. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงาน ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ต้นฉบับ

แนบสัญญาเลขที่ ศก.๒/ ๓๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
งานก่อสร้าง
ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙

****

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวง ไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง

๓. ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมฯ อนุมัติ เลขที่ สมท. ๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา

๔. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ที่ได้รับแจ้ง

๕. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงาน ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา

๖. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างตามสิทธิ์การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนฯ

๗. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประกวดราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

๘. ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

๙. ผู้รับจ้างที่มีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

๑๐. ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปริญญา สาลีวัน)
กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

อากรแสตมป์ ๕ บาท อากรแสตมป์ ๕ บาท

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

ttb 0001 BAHT * 1,498,775.00**

เลขที่ 212301487

วันที่ 21 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย สรวีย์ พรรณกนกศักดิ์ และ น้ำฝน เตรียมพิทักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุง ขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม.10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ศก.2/36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,498,775.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,498,775.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ค้ำประกัน
(สรวีย์ พรรณกนกศักดิ์) (น้ำฝน เตรียมพิทักษ์)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ TMBThanachart Bank Public Company Limited Si Sa Ket Branch

ผู้มีอำนาจลงนามแทนธนาคาร

ลงชื่อ..... พยาน
(ภาวิณี ศิริภญญ์ไพศาล) (วิชุลดา มาตรี)

อนุมัติ

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)
ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

00046855

กรณีขอให้ธนาคารยืนยันว่าธนาคารเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ หรือเรียกร้องให้ธนาคารชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ กรุณาติดต่อหรือส่งจดหมายไปที่ งานค้ำประกัน ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ เลขที่ 3000 ถนน พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2299-1111 ต่อ งานค้ำประกัน

LG999

เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร

0229-31-0

ที่ 100922018318

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0335565000324
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายปริญญา สาลีวัน
   2. นางสาวระยงค์ วรรณวงษ์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 220,000,000.00 บาท / สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(นางสาวไอย์สุดารัชต์ หอมสมบัติ)
นายทะเบียน

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGARUN CO.,LTD.

ที่ 100922018318

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922018318

1. บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ
ทะเบียนเลขที่ 0333546000410 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้กรดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นเว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ยาสัตว์ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(12) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(15) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(16) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(17) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(18) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์

(19) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและถลุงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงน้ำแข็ง

(20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

(21)ประกอบกิจการประมง แหปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระเบิดและย่อยหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนต์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(28) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งถ่ายเอกสาร

(29) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนต์

(30) ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการคิดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(31) ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก และการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(33) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(34) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงาน หาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย

(35) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 42 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเข้ารับการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(37) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการหรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(38) ประกอบธุรกิจประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(39) ประกอบกิจการขุดทราย ดูดทราย เพื่อจำหน่าย

(40) ประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

(41) ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลค์คอนกรีต

(42) ประกอบกิจการให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ออกหนังสือรับรองหรือหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ให้แก่บริษัทหนี้และต่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การรัฐ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

แบบ บอจ. 2

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค.

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด" เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อ 3 วัตถุที่ประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 43 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ "-"

(เว้นแต่ถ้ามีการรับผิดโดยไม่จำกัดได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับผิดชอบนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุ "-")

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน สองร้อยยี่สิบ บาท (220,000,000)

แบ่งออกเป็น สองล้านสองแสน หุ้น (2,200,000) (ตัวอักษร) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท (100) (ตัวเลข)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ลายมือชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าชื่อซื้อไว้ รวม กน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้นี้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่ เสนาธรรมศาสตร์ ได้ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 200 บาทแล้ว

ที่อยู่

อาชีพ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ) หุ้นใบสมัครซื้อหุ้นเล่มที่ (ถ้ามี)

(2) อายุ ปี ได้ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงินแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565

เลขที่

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่ (นางสาวรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ)

อาชีพ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(3) อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์ นายทะเบียน

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่

อาชีพ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

(4) อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่

ที่อยู่

อาชีพ ได้เข้าชื่อซื้อหุ้นไว้แล้ว หุ้น (ลงลายมือชื่อ)

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

(ลงลายมือชื่อ) ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายปริญญา สาลีวัน)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ (นางสาวรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ)

33002650309000 1

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

(ทุน สองร้อยยี่สิบล้าน บาท แบ่งออกเป็น 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว สองล้านสองแสน (ตัวอักษร) หุ้น (2,200,000 (ตัวเลข))

เป็นหุ้นสามัญ สองล้านสองแสน หุ้น (2,200,000) ชนิดเดียว / และหุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) สองล้านสองแสน หุ้น (2,200,000)

และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) - หุ้น (-)

ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุ้นละ -บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ-บาท) - หุ้น (-)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) - หุ้น (-)

และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) - หุ้น (-)

ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุ้นละ -บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ-บาท) - หุ้น (-)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ หนึ่งร้อย (ตัวอักษร) บาท (100)

และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ -บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ - บาท (-)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ - บาท (-)

และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ -บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ - บาท (-)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ หนึ่งร้อย (เต็มมูลค่า) บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว สองร้อยยี่สิบล้าน บาท

และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ -บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ -บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท

และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ -บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น สองร้อยยี่สิบล้าน บาท (220,000,000)

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน 1 คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ

"กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายปริญญา สาลีวัน)

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ (ท่างสุวรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ)

3300265030900 01

แบบ บอจ. 3

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี กำหนดอายุ.....

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี :- 1 แห่ง คือ

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 3309-0275732 ตั้งอยู่เลขที่ 24 อาคาร.....
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ค่าน อำเภอ/เขต ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160 หมายเลขโทรศัพท์ 0878799825
หมายเลขโทรสาร..... *E-mail ssisaket.ecc@gmail.com
ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้
1..... 2.....

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน ตั้งอยู่เลขที่..... อาคาร.....
ห้องเลขที่ ..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์..... .....
หมายเลขโทรสาร..... E-mail.. .....

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้
-ไม่มี-

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี ข้อบังคับ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นายปริญญา สาลีวัน)

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ .....
3300265030900 01

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
(ลงลายมือชื่อ).....นายทะเบียน
(นางสุรีรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ)

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย

แบบ บอจ. 5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ชื่อบริษัทจำกัด	บริษัท ทำทรายรุ่งอรุณ จำกัด	ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

☑ ณ วันประชุม ○ จัดตั้งบริษัท ○ ทำบัญผู้ถือหุ้น ○ วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ แปรสภาพ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

☐ คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่

ทุนจดทะเบียน สองร้อยยี่สิบล้าน บาท แบ่งออกเป็น สองล้านสองแสน หุ้น มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท

ผู้ถือหุ้น ไทย 3 คน จำนวน 2,200,000 หุ้น อื่น ๆ - คน จำนวน - หุ้น

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น / เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวนิติบุคคล / บัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่ / สัญชาติ[3] / อาชีพ / ที่อยู่	จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว[3]	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	
			มีอำชำระแล้ว[3]	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
1	นายปริญญา สาลีวัน 1 3 3 0 9 0 0 1 1 3 5 7 5 ไทย / นักธุรกิจ 153 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวคง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	2,058,000	หุ้นละ (1) 100 (2)	1 - 2,058,000	04/03/2565	04/03/2565	
2	นายไพโรจน์ สาลีวัน 3 3 3 0 9 0 0 0 6 0 3 6 2 ไทย / นักธุรกิจ 24 หมู่ที่ 11 ตำบลคำน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	110,000	หุ้นละ (1) 100 (2)	2,058,001 - 2,178,000	04/03/2565	04/02/2565	
3	นางสาววระยงค์ วรรณเวงษ์ 3 3 3 0 9 0 0 2 4 8 1 6 7 ไทย / นักธุรกิจ 25 หมู่ที่ 13 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	22,000	หุ้นละ (1) 100 (2)	2,178,001 - 2,200,000	04/03/2565	04/03/2565	
			หุ้นละ (1) (2)				

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบการขอ... 330026503090001

ลงชื่อ ... (นายทะเบียน)

บริษัท ทำทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGARUN CO.,LTD

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วนตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปริญญา สาลีวัน)

หมายเหตุ ช่อง "เงินที่ชำระแล้ว (1)" ให้ระบุจำนวนเงินสำหรับหุ้นที่ชำระแล้วแต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระเป็นเงิน
ช่อง "ยังมิได้ชำระแล้ว (2)" ให้ระบุสำหรับหุ้นที่ยังมิได้ชำระแล้วแต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แรงงาน
ช่อง "สัญชาติ (3)" หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

เลขที่ 100923004629 วันที่ออกเอกสาร : 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.37 น.

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม 2 รายการ เป็นดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัทมี 2 แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 3309-027573-2 ตั้งอยู่เลขที่

24 หมู่ที่ 11 ตำบลค่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

หมายเลขโทรศัพท์ 0878799825

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน 3387-001850-0 ตั้งอยู่เลขที่

93 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33240

หมายเลขโทรศัพท์ 0878799825

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้นี้

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายปริญญา ลาลีวัน)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 3.3.0.0.2.6.5.0.3.1.6.0.0.0 (นางสาวณัฐกฤตา ศีลสอย)

/Rel/C/Users/SAI/Downloads/form_boj4.pdf

แบบ บอจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม 1 รายการ เป็นดังนี้

1.ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุที่ประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายปริญญา สาตีวัน)

หน้าที่ 1 ของจำนวน 1 หน้า (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 3 3 0 0 2 6 5 0 6 2 9 0 0 0 0 4 (นางสาวณัฐกฤตา ศีลสอน)

/D/งานสู่ เริ่มใหม่/งานหน้าเว็บเพิ่มสาระบริษัท พงษ์วิเศษมิเนอเรล/form_boj4.pdf

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม 1 รายการ เป็นดังนี้

1.ให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ เป็นดังนี้

กรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน (ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก.) คือ

(1) นางสาวระยงค์ วรรณวงษ์

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด
THASAIRUNGARDON CO.,LTD

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นายปริญญา สาลีวัน)

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ 330265092900 4

(ลงลายมือชื่อ).....นายทะเบียน
(นางสุวรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ)

/C/Users/Jira-PC/Desktop/1234/form_boj4.pdf

ภ.พ.20
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0 - 3 3 5 5 - 6 5 0 0 0 - 3 2 - 4

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

เป็น [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 24

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย ถนน -

ตำบล/แขวง ตาน อำเภอ/เขต ราษีไศล

จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21 เมษายน 2546

ออกให้เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2555

ผู้ออกทะเบียน

(นางเจียระพรรณ์ จิตอัญญา)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ

สำเนา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ

ถ้าใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดนั้น ถูกทำลายหรือสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ภายในสิบห้าวันต้องยื่นคำขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานประเมินและหรืออธิบดี

09330090-25650309-1-01-000001 ภพ09-09330090-09330090-7-01-25650318-0-0-0004-00- 09330000

ทะเบียนเลขที่ 0335565000324

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

ออกให้ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565


(นางสาวรรณา ชาญภูมิกาญจนเลิศ)

นายทะเบียน

บริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ จำกัด THASAIRUNGAROON CO.,LTD.

หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ ทะเบียนเลขที่ 0333546000410 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3309 00113 57 5
Identification Number
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ปริญญา สาลีวัน
Name Mr. Parinya
Last name Saleewan
เกิดวันที่ 14 พ.ค. 2529
Date of Birth 14 May 1986
ที่อยู่ 153 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวตะเคียน อ.ศิลาลาด
จ.สระแก้ว
8 ก.พ. 2564
8 Feb 2021
13 พ.ค. 2572
13 May 2029
3309-00-02051427


BORA-10.8-02-2563
ประเทศไทย
THAILAND
ME3—1444896—28


บริษัท ทาสารุงอรุณ จำกัด
THASARUNGAROON CO.,LTD

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 3309-000772-0 สำนักทะเบียนอำเภอศิลาลาด

รายการที่อยู่ 153 หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นายยุทธพงษ์ ทวิชศรี)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 3 กันยายน พ.ศ.2564

1



4

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3309-000772-0 ลำดับที่ 3

ชื่อ นายปริญญา สาลีวัน สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-3309-00113-57-5 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 14 พ.ค. 2529

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เอี่ยม 3-3309-00060-35-4 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ จรูญ 3-3309-00060-34-6 สัญชาติ ไทย

* มาจาก
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 24 พ.ค. 2529

นายทะเบียน
(นายยุทธพงษ์ ทวิชศรี)

** ไปที่

นายทะเบียน
